



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI

KAMU YATIRIMLARI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

RAPORU

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. Genel Değerlendirme	1
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemiz Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.3. Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	9
1.4. Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	13
2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları	15
2.1. Eğitim Sektörü.....	16
2.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	16
2.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler	17
2.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	17
2.1.4. Muhtelif İşler.....	17
2.2. Sağlık Sektörü	24
2.2.1. Çocuk Hastanesi Projesi.....	24
2.2.2. Muhtelif İşler Projesi.....	24
2.3.Sosyal DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü	43
2.3.1. İmmunobioteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	43
2.3.2. Plazma Teknolojileri İleri Araştırma Merkezi	44
2.3.3. Fotonik Araştırma Merkezi	45
2.3.4. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	50
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	51
EK-1 2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	53
EK-2 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	54

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


1. Genel Değerlendirme

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemizin 2012 yılı bütçesi, 2011 yılına göre yaklaşık %1 artarak 404.520.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin 2012 yılında belirlenen ödenekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
PERSONEL GİDERLERİ	252.820.000,00
SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİD.	44.758.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	59.935.000,00
CARİ TRANSFERLER	7.507.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	39.500.000,00
TOPLAM	404.520.000,00

2012 yılı bütçe ödeneğinde en fazla paya sahip olan gider grubu, önceki yıllarda olduğu gibi “Personel Giderleri”dir. Personel Giderleri Üniversitemiz bütçesinin %62,5’ini oluşturmaktadır. Bu hesap grubu, Sosyal Güv. Dev. Prim Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde belirtilen oran %73,56’a çıkmaktadır. 2012 yılı bütçe ödeneklerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

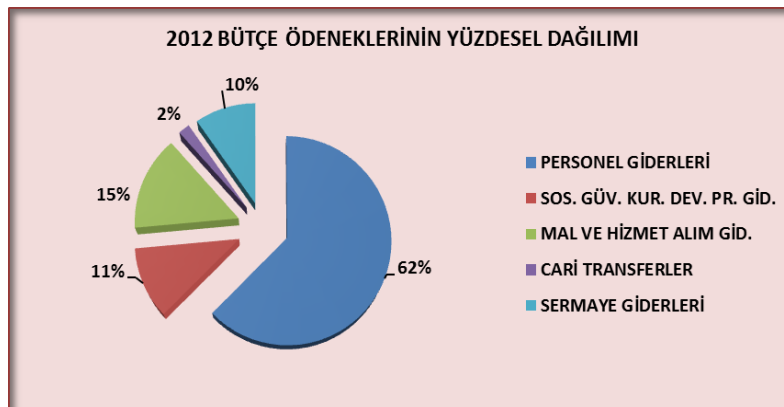

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan Eğitim Sektöründe 4, Sağlık Sektöründe 2 ve DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe 4 olmak üzere toplam 10 adet projenin finansmanı için Üniversitemiz bütçesinden karşılanmak üzere 39.500.000,00 TL, ayrıca sağlık sektöründe yer alan projelerimizin finansmanı için döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 5.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

Üniversitemizin 2012 yılı yatırım ödeneğinin bileşenlerine bakıldığında %78,5'inin (31.000.000,00 TL) Hazine Yardımı, %21,5'inin ise Öz Gelirlerden oluştuğu görülmüştür. 2012 yılı yatırım ödeneği ve bileşenleri bir önceki yılın ödenekleri ile karşılaştırıldığında; toplamda %11, Hazine Yardımı'nda %26 oranında arttığı, Öz Gelirde ise %22,8 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2011	2012	DEĞİŞİM ORANI
ÖZGELİR	11.000.000,00	8.500.000,00	-%23
HAZİNE YARDIMI	24.610.000,00	31.000.000,00	%26
TOPLAM	35.610.000,00	39.500.000,00	%11

2012 yılında, 2012 Yılı Yatırım Programı ödeneği olan 39.500.000,00 TL'ye yıl içerisinde;

- Eğitim Sektörü 2011H032280 numaralı Muhtelif İşler projesine 2.000.000,00 TL, Sağlık Sektörü 2010I000350 numaralı Muhtelif İşler projesine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.000.000,00 TL Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden,
- Eğitim Sektörü 2011H032280 numaralı Muhtelif İşler projesine 4.200.000,00 TL (büyük onarım için 4.000.000,00 TL, yayın alımları için 200.000,00 TL) Üniversitemiz likit imkanlarından ekleme yapılmış olup, 47.700.000,00 TL ödeneye ulaşılmıştır.

2012 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ

BIN TL

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	2012 Yılı Başlangıç Ödeneği	Yıl İçerisinde Yapılan Ekleme	Yıl İçerisinde Yapılan Düşme	2012 Yılı Toplam Ödenek
2008H032320	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	10.000,00	2.500,00	3.000,00	9.500,00
2011H032280	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	6.750,00	9.200,00		15.950,00
	Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	3.000,00			3.000,00
2012H030870	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	250,00			250,00
1999H050070	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2.500,00		2.500,00	0,00
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM			22.500,00	11.700,00	5.500,00	28.700,00
1998I001310	Çocuk Hastanesi (350 Yt, 65000 m2)	DÖNER SERMAYE	1,00			1,00
2010I000350	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	4.999,00			4.999,00
	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	5.000,00	2.000,00		7.000,00
SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM			10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
2009K120670	İmmunobiyoteknoloji Araş. ve Uyg. Mrk.	ÖZEL BÜTÇE	2.000,00			2.000,00
2011K120290	Fotamik Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	4.450,00			4.450,00
2012K120650	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	5.500,00			5.500,00
2012K121110	Plazma Teknolojileri İleri Araştırma Mrk.	ÖZEL BÜTÇE	50,00			50,00
SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ TOPLAM			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

1.2. Üniversitemiz Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Üniversitemiz kuruluşu ile birlikte hızla büyüyüp ulusal düzeyde kendini kabul ettirerek, uluslararası düzeyde de ilişkilerini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Fen, Edebiyat, Hukuk, Tapu-Kadastro, Teknoloji, Turizm, Sanat Tasarım, Bankacılık, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri alanlarında eğitim verilen Üniversitemizde bugün her biri sahasında söz sahibi 21 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 5 yüksekokul ile 12 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Bilimsel araştırmaları organize etmek, toplumla bütünleşmek gibi gereksinimlere cevap vermek üzere çok sayıda araştırma merkezimiz bulunmakta ve hizmet verilmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz 116 adet hizmet binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Rektörlük Kampusu içerisinde bulunan açık Tenis Kortları, Açık Voleybol ve Basketbol Sahası, Bowling Salonu, spor tesisleri, futbol sahası ve plaj voleybolu sahalarının altında squash salonu, fitness salonu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesi içinde Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu ve Sauna yer almaktadır.

Merkez kampus içinde öğrenci sosyal etkinlik alanı olarak hizmet vermekte olan Mavi Ev, akademik ve idari personelimizin hizmetinde kullanılmak üzere Kirevi Tesisleri ve Kültür Merkezi yer almaktadır.

Merkez kampuste bulunan Gazi Üniversitesi Vakfı Kız Öğrenci Misafirhanesi; 120 odalı, 240 yatak kapasiteli bir tesis olup, yemekhane, kantin, çamaşırhane ve fitness salonlarını içerisinde barındıran bir tesistir. Ayrıca 88 adet lojman mevcuttur.

Gölbaşı yerleşkesinde turizm sektöründe hizmet veren Gazi Gölbaşı Tesisleri bulunmaktadır. Tesisin otel bölümünde 2 junior suit, 14 standart olmak üzere toplam 16 oda 30 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Tesis içerisinde 180 ve 90 kişi kapasiteli iki adet konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca Gölbaşı yerleşkemizde basketbol, voleybol, tenis kortu ve halı sahadan oluşan spor tesisleri yer almaktadır.

Yenimahalle Diş Polikliniđi ve ayyolunda hayırseverler tarafından yaptırılan İbrahim ve Firuzet İmirzalıođlu semt polikliniđi, Polatlı Fen Edebiyat Fakóltesi açılmış olup tüm tadilat ve onarımları (Laboratuar, kütüphane, derslik vs. düzenlemeleri) Polatlı Belediyesi ve POYED (Polatlı Yüksekokul Koruma ve Yaşatma Derneđi) tarafından karşılanmış olan bina TOKİ tarafından Üniversitemize hibe olarak verilmiştir. Bunun dışında Ostim Meslek Yüksekokulu binası OSTİM Yönetimi tarafından Üniversitemize bağışlanmış olup, iç tadilat, atölye ve otel kısımlarının tadilat ve onarımları da Ostim Yönetimi tarafından yaptırılmıştır.

1982 yılında kurulan ve İ.İ.B.F. bahçesindeki geçici binasında hizmet veren Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2004 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde bulunan 5 katlı 11.000 m² kullanım alanına sahip yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kitap Sayısı:	245.155 adet
Kitap Dışı (DVD,CD,VCD)	50.787 adet
Basılı tez	13.011 adet
Açık erişim tez	5.611 adet
Basılı Periyodik Yayın Aboneliđi	714 adet
Elektronik dergi aboneliđi	143 adet
Ciltlenmiş Periyodik Yayın Sayısı	79.484 adet
Elektronik Yayın Sayısı	
Elektronik veri tabanı	88 adet
e-kitap	112.112 adet
e-Referans	120 adet
e-tez	2.100.000 adet
e-dergi	50.523 adet

EĞİTİM ALANLARI

Birimler	Derslik (Sayı-Kapasite-m2)						Laboratuvar (Sayı-Kapasite-m2)						Eğitim Alanı Toplamı		
	Anfi			Sınıf			Bilgisayar Laboratuvarı			Diğer Laboratuvar			TOPLAM (Ders+Lab)		
	Sayı	Kapasite	m2	Sayı	Kapasite	m2	Sayı	Kapasite	m2	Sayı	Kapasite	m2	Sayı	Kapasite	m2
FAKÜLTELER	61	7.006	7.017	437	28.760	48.305	83	2.199	5.728	261	6.632	32.234	842	42.643	93.284
Türk Müziği Devlet Konservatuarı				9	75								9	75	0
YÜKSEKOKULLAR	0	0	0	96	2143	2602	6	124	272	4	75	430	96	2143	2602
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	0	0	0	52	2641	3052	17	303	1118	4	110	250	57	2678	4052
ENSTİTÜLER	0	0	0	5	150	174	0	0	0	0	0	0	5	150	174
TÖMER				24	360	834	1	20	45				25	380	879
GENEL TOPLAM	61	7006	7017	623	34129	54967	107	2646	7163	269	6817	32914	1034	48069	100992

SOSYAL ALANLAR

BİRİMLER	KANTİN-KAFETERYA			TOPLANTI SALONU (ADET)				KONFERANS SALONU(ADET)				SPOR TESİSLERİ			
	ADET	M ²	KAPASİTE (Kişi)	Kapasite (Kişi)		Kapasite (Kişi)	M ²	Kapasite (Kişi)		Kapasite (Kişi)	M ²	AÇIK		KAPALI	
				0-50	51-Üzeri			0-50	51-Üzeri			ADET	M ²	ADET	M ²
İDARİ BİRİMLER	0	0	0	1	0	50	132	0	2	543	780	3	4.550	1	2.000
FAKÜLTELER	30	8.549	1.675	49	2	1.047	2.258	3	14	4.339	5.504	0	0	1	2.100
Türk Müziği Devlet Konservatuarı															
YÜKSEKOKULLAR	3	64	0	2	0	0	0	0	1	100	115	1	1.000	12	5.200
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	5	670	190	4	0	100	166	1	3	875	1.136	5	12.534	0	0
ENSTİTÜLER	0	0	0	3	0	70	99	0	0	0	0	0	0	0	0
TÖMER	1	175	50	1		20	50								
GENEL TOPLAM	39	9.458	1.915	60	2	1.287	2.706	4	20	5.857	7.534	9	18.084	14	9.300

HİZMET ALANLARI

BİRİMLER	AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANI			İDARİ PERSONEL HİZMET ALANI			AMBAR ALANLARI		ARŞİV ALANLARI		ATÖLYE	
	ÇALIŞMA ODASI			ÇALIŞMA ODASI								
	SAYISI (ADET)	ALAN M ²	KULLANAN SAYISI (KİŞİ)	SAYISI (ADET)	ALAN M ²	KULLANAN SAYISI (KİŞİ)	SAYISI (ADET)	ALAN M ²	SAYISI (ADET)	ALAN M ²	SAYISI (ADET)	ALAN M ²
İDARİ BİRİMLER	0	0	0	175	5.658	778	6	303	3	330	0	0
FAKÜLTELER	2.713	40.723	3.630	487	14.531	1.426	57	3.167	36	2.406	193	20.452
Türk Müziği Devlet Konservatuarı	4		16	6		10						
YÜKSEKOKULLAR	71	1.171	140	19	217	30	3	80	2	50	1	72
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	98	2.097	138	52	1.297	65	9	223	6	175	14	1.006
ENSTİTÜLER	13	241	26	33	845	58	0	0	6	165	0	0
TÖMER	15	395	48	7	140	7	1	60	1	30		
GENEL TOPLAM	2.914	44.627	3.998	779	22.688	2.374	76	3.834	54	3.157	208	21.530

YEMEKHANE ALANLARI

	SAYI	ALAN	KAPASİTE M2
ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ	14	8.350	3.100
PERSONEL YEMEKHANESİ	17	4.600	2.244
TOPLAM	31	12.950	5.344

Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları

Anaokulu Sayısı	2 Adet
Anaokulu Alanı	800 m ²
Anaokulu Kapasitesi	180 Kişi
İlköğretim okulu Sayısı (MEB Yatan	1 Adet
İlköğretim okulu Alanı	10 m ²
İlköğretim okulu Kapasitesi	6 Kişi

GAZİ HASTANESİ

Birim	Sayı (Adet)	Alan (m2)	Birim	Sayı (Adet)	Alan (m2)
Acil Servis	1	5.550	Mutfak	1	1.100
Yoğun Bakım	9	1.990	Çamaşırhane	1	457
Ameliyathane	18	2.560	Teknik Servis	1	140
Klinik	1	30.625	Poliklinik Binası	1	24.020
Laboratuar	10	3.200	İdari, Hizmet, Tetkik Katları		17.530
Eczane	1	605	Radyoterapi Alanı	1	684
Radyoloji Alanı	1	2.800	Hemodiyaliz Alanı	1	1.500
Nükleer Tıp Alanı	1	1.415	E Blok	1	38.400
Sterilizasyon Alanı	1	1.400	Hastane Toplam Kapalı Alanı		133.976

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Birim	Sayı (Adet)	Alan (m2)	Birim	Sayı (Adet)	Alan (m2)
Ameliyathane	4	162,31	Çamaşırhane	1	29
Klinik	14	4.881,89	Teknik Servis	4	100
Laboratuar	3	686,08	Bürolar, Depo vs		6.945,5
Radyoloji Alanı	1	202,76	E Blok		2.626,9
Sterilizasyon Alanı	1	93,46	Hastane Toplam Kapalı Alanı		16.128
Mutfak	1	400			

1.3. Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapılan işler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

PROJE NUMARASI	2012H030870
PROJE ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
HEDEFLLENEN	YIL İÇİNDE YAPILACAK İŞLERİN ETÜD VE PROJESİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER	MÜH.FAK.DEK.GİRİŞİ MERDİVEN DÜZENLENMESİNE AİT BETONARME UYG.PRJ., İİBF YAPILACAK ASANSÖR BİNASINA AİT BETONARME PRJ VE ÇELİK KONST.UYG.PRJ.VE ANAHTAR TESLİMİ KEŞİF HAZIRLANMASI, REK.KAMP.A KAPISI GÜVENLİK ODASI SEMBOL VE KULE KEMER YAPIMINA İLİŞKİN PRJ.
	G.Ü.TIP FAK.ARŞ VE UYG HAST.3. KAT BEYİN CER.AMELİYATHANE MİMARİ UYG.PROJESİ VE METRAJ HAZIRLANMASI İŞİ
	G.Ü.KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ SAHASI JEOLJİK JEOTEKNİK ETÜDLERİ VE RAPOR HZ.İŞİ
	G.Ü.GÖLBAŞI KAMP.YADEM İŞİNE AİT HAZIRLIK VE ETÜD ÇALIŞMALARI MİMARİ VE ÖN PROJE 3 BOYUTLU GÖRSEL TASARIMLARIN HZ.İŞİ
	G.Ü MERKEZ KAMPÜSÜ A GİRİŞİ PARKI PEYZAJ PROJESİ YAPILMASI İŞİ
	G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ YADEM MİMARİ UYGULAMA PROJESİNE AİT SİSTEM VE MONTAJ DETAYLARI TEKNİK ŞARTNAME METRAJ VE MALİYET ANALİZ HAZIRLANMASI İŞİ.
	G.Ü.GÖLB.KAMP.YADEM MİMARİ UYGULAMA PROJESİ HAZIRLAMA İŞİ
	G.Ü.YAPILMASI PLANLANAN HUKUK FAK.NİN 1/100 ÖLÇEĞİNDEKİ GENEL YERLEŞKE MAKETİ YAP.İŞİ
	G.Ü. REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ A KAPISI TASARIM İŞİ

PROJE NUMARASI	1999H050070
PROJE ADI	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ
HEDEFLenen	GÖLBAŞI'NDA SPOR TESİSLERİ YAPTIRILMASI
GERÇEKLEŞTİRİLEN	YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İHALENİN AYRILAN ÖDENEK TUTARINI AŞMASI SEBEBİYLE İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR. TAHSİS EDİLEN 2.500.000,00-TL. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER BÜTÇE TERTİBİNE AKTARILMIŞTIR.

PROJE NUMARASI	2011H32280	
PROJE ADI	Eğitim Sektörü Muhtelif İşler (Yayın Alımı)	
HEDEFLenen	KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, ABONELİKLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ, KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	
GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER	Yurtiçi Kütüphaneler arası işbirliği ödünç verilen materyal	285 adet
	Yurtiçi Kütüphaneler arası işbirliği ödünç alınan materyal	87 adet
	Yurtdışı Kütüphaneler arası işbirliği ödünç verilen materyal	9 adet
	Yurtdışı Kütüphaneler arası işbirliği ödünç alınan materyal	34 adet
	Makale (Gönderilen)	12 adet
	Makale (Alınan)	28 adet
	Ödünç verilen yayın sayısı	507.186 adet
	Ödünç verilen dergi sayısı	69 adet
	Koleksiyona eklenen kitap sayısı	19.915 adet
	Açık erişim eklenen tez	403 adet
	Koleksiyona eklenen kitap dışı materyal	1611 adet
	Abone olunan dergi sayısı	857 adet
	Ciltlenen dergi sayısı	888 adet
	Kataloglanan kitap sayısı	6.862 adet
	Bilgisayara girilen cilt kopya sayısı	10.569 adet
	Çekilen fotokopi sayısı	917.757 sayfa
	Abone olunan On-line veri tabanı	88 adet
	Elektronik dergi	50.523 adet
	Elektronik kitap	112.112 adet
	Elektronik tez	2.100.000 adet
	G.Ü. Tez (Açık Arşiv)	5611 adet
	Veritabanlarında yapılan tarama	1.618.173 adet
	Oryantasyon	981 kişi adet
	Kütüphane üye sayısı	99.094 kişi
	Cevaplanan sorular	90.883 adet

PROJE NUMARASI	2011H32280
PROJE ADI	Eğitim Sektörü Muhtelif İşler (Büyük Onarım)
HEDEFLenen İŞLER	YIL İÇİNDE YAPILAN İŞLER
EĞİTİM FAKÜLTESİ C BLOK ÇATI ONARIMININ YAPILMASI İŞİ	EĞİTİM FAKÜLTESİ D BLOK ÇATI ONARIMININ YAPILMASI
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ENGELLİ YOLU TANZİM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ENGELLİ YOLU TANZİM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
F BLOK DIŞ CEPHE VE BİNA ÖNÜ PEYZAJ TANZİMİ	F BLOK DIŞ CEPHE VE BİNA ÖNÜ PEYZAJ TANZİMİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖNÜ PEYZAJ DÜZENLEMESİ İŞİ	MERKEZ KAMPÜS PEYZAJ DÜZENLEMESİ İŞİ
	GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ F-K BLOK ÖNÜ ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI İŞİ
GÖLBAŞI YADEM A BLOK DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ	GÖLBAŞI YADEM A BLOK DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KONFERANS SALONU VE DERSLİK ONARIMI İŞİ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU'NUN DİĞER ONARIMLARI YAPILMIŞTIR.
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIK BİNASI VE LABORATUVAR BİNASI DIŞ CEPHE TADİLATI İŞİ	FEN FAKÜLTESİ DERSLİK, DEKANLIK VE LABORATUVAR BİNALARI ONARIM VE TADİLAT İŞİ
	FEN FAKÜLTESİ Z.09 LABORATUVAR TAD. ONARIM İŞİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. ÇELİK KONSTRÜKSİYON ASANSÖR KULESİ YAPIM İŞİ (TEMEL VE SUBASMAN HARİÇ)	İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. ÇELİK KONSTRÜKSİYON ASANSÖR KULESİ YAPIM İŞİ (TEMEL VE SUBASMAN HARİÇ)
MAVİ SPOR SALONU ONARIMI İŞİ	MAVİ SPOR SALONU ONARIMI İŞİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI ONARIM İŞİ	ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
TIP FAKÜLTESİ E BLOK DOĞALGAZ REGLAJ İSTASYONU VE DOĞALGAZ TESİSATI YAPIMI İŞİ	TIP FAKÜLTESİ E BLOK DOĞALGAZ REGLAJ İSTASYONU VE DOĞALGAZ TESİSATI YAPIMI İŞİ
GÖLBAŞI LAPAROSKAPİK CERRAHİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİNASI ÇATI ONARIMI İŞİ	GÖLBAŞI LAPAROSKAPİK CERRAHİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİNASI DOĞALGAZ TESİSATI İŞİ
	TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATÖLYE DIŞ CEPHE BOYA İLE OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DIŞ CEPHE BOYA VE ÇATI ONARIM İŞİ
	GÖLBAŞI KAMPÜSÜ AVRUPA BİRİLİĞİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONAKLAMA MERKEZİ BİNALARI ONARIM İŞİ
	ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIK BLOĞU TADİLAT GİRİŞ DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ BLOKLAR ONARIM, DIŞ CEPHE TADİLATI VE ÇEVRE TANZİMİ İŞİ

PROJE NUMARASI	2010I000350
PROJE ADI	Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi
HEDEFLenen İŞLER	YIL İÇİNDE YAPILAN İŞLER
G.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 15. KAT YENİ DOĞAN ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SERVİSLERİ DONANIM VE ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ, 14. KAT KBB PLASTİK CERRAHİ SERVİSLERİ 13. KAT ÖZEL SERVİSİ YAPIM İŞİ ⁱ	G.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 15. KAT YENİ DOĞAN ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SERVİSLERİ DONANIM VE ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ, 14. KAT KBB PLASTİK CERRAHİ SERVİSLERİ 13. KAT ÖZEL SERVİSİ YAPIM İŞİ
G.Ü.TIP FAK. GASTROENTROLOJİ MUTFAK, YEMEKHANE, AYAKTAN CERRAHİ MERKEZİ VE TEKNİK BİRİMLER ⁱⁱ	G.Ü.TIP FAK. GASTROENTROLOJİ MUTFAK, YEMEKHANE, AYAKTAN CERRAHİ MERKEZİ VE TEKNİK BİRİMLER
G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ E BLOK 7. KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ İKMAL İŞİ VE 6. KAT GÖZ SERVİSİ YAPIM İŞİ ⁱⁱⁱ	G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ E BLOK 7. KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ İKMAL İŞİ VE 6. KAT GÖZ SERVİSİ YAPIM İŞİ
	G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HAST. 3. KAT BEYİN CERRAHİ SERVİSİ YAPIM İŞİ
	G.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. ENGELLİ KLİNİĞİ EK BİNA TADİLATI AÇIK VE KAPALI OTOYOL YAPIMI VE B BLOK TADİLATI VE ONARIM İŞİ


ⁱ Yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemeleri

ⁱⁱ Yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemeleri


ⁱⁱⁱ Yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemeleri

1.4. Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin yatırım projeleri için yapılan harcamalar 2012 yılında bir önceki yıla göre %8,28 oranında artarak 45.695.792,99 TL'ye ulaşmıştır. 2011-2012 yıllarında yapılan yatırım harcamaları bütçe ekonomik kodları itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

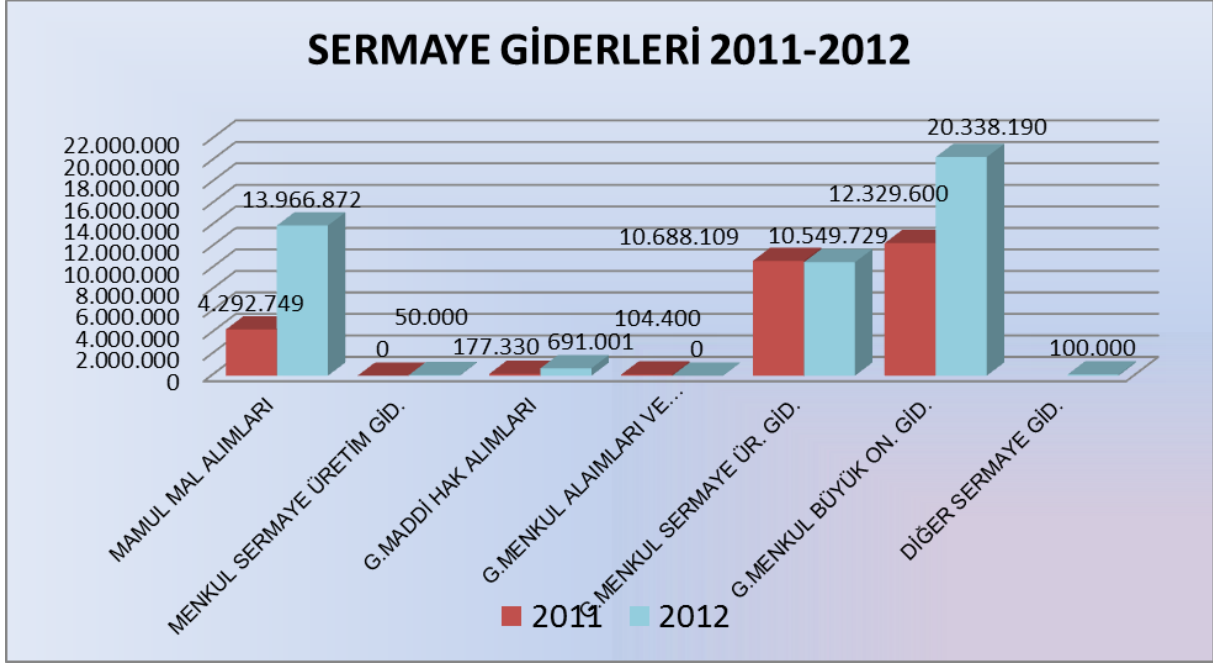

2012 yılı yatırım harcamasının %73,87'si Hazine Yardımı ile finanse edilmiştir. Bu husus aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

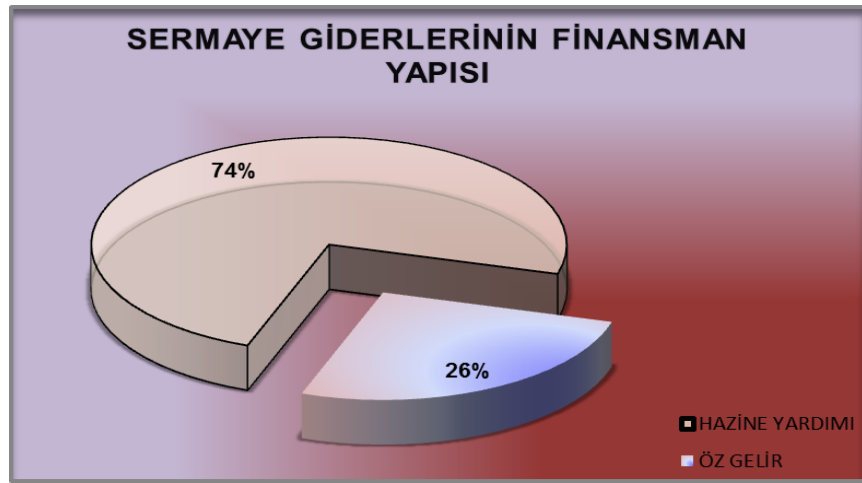

2012 yılı yatırım harcamalarının sektörel dağılımına bakıldığında en fazla harcamanın eğitim sektöründe yapıldığı görülmüştür. Eğitim sektöründe yapılan harcamalar, yatırım harcamalarının %58,44'ünü (26.707.000,00 TL) oluşturmuştur. 2012 yılı yatırımlarının sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.^{iv}

ÖZEL BÜTÇE

SEKTÖR	2012YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2012 YILI REVİZE ÖDENEK	NAKDİ GERÇEKLEŞME
EĞİTİM	22.500	28.700	26.707
SAĞLIK	5.000	7.000	6.990
DKH-EĞİTİM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR	12.000	12.000	12.000
TOPLAM	39.500	47.700	45.697

DÖNER SERMAYE

SAĞLIK	5.000	5.000	5.973
--------	-------	-------	-------

2012 yılında Eğitim Sektörü 2011H032280 numaralı Muhtelif İşler projesi ile DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü 2012K120650 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Üniversitemizin öz gelirlerinin kullanılması planlanmıştır. Bu kapsamda Eğitim Sektörü 2011H032280 numaralı Muhtelif İşler projesinde (Büyük Onarımlar) kullanılmak üzere 3.000.000,00 TL öz gelirler karşılığı ödenek öngörülmüş olup, yıl içerisinde öz gelir gerçekleşme durumu göz önünde bulundurularak 2.200.000,00 TL ödenek kaydedilmiş ve bu tutarın 1.823.835,99 TL'si harcanmıştır. Öğrenci harç gelirleri ile öncelikle öğrencilerin beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetleri ve diğer giderleri karşılanmaktadır.

2012K120650 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 5.500.000,00 TL öz gelirler karşılığı ödenek belirlenmiş olup, bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen

^{iv} Tablodaki değerler bin TL olarak belirtilmiştir.

Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer alan G.Ü. Gölbaşı Kampüsü Açık-Kapalı Spor Tesisleri Yapılması İşi 2012 yılında iptal edilmiş olup, bu işin ödeneği 2008H032320 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır.

Sağlık sektöründe 2010I000350 numaralı Muhtelif İşler projesine Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000,00 TL eklenmiş olup, 6.989.575,86 TL harcama yapılmıştır. Aynı porjenin döner sermaye kaynaklı ödeneğinden ise 5.973.224,32 TL harcama yapılmıştır.

DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründeki bütün ödenekler (12.000.000 TL) Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları

Üniversitemizde yürütülen yatırım projeleri kamu kaynaklı olup, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen yatırım projesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Üniversitemizde 2012 yılında tamamlanan yatırım projesi de bulunmamaktadır. Bu nedenle “Proje Tamamlama Raporu” düzenlenmemiştir.

Raporun bu bölümünde Ünversitemizde 2012 yılında yürütülen yatırım projeleri kapsamında yapılan işler ile harcama tutarları sektörler ve projeler itibariyle açıklanmıştır.

2.1. Eğitim Sektörü

2.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2012 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Eğitim Sektörü 2012H030870 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında dokuz proje hizmet alımı yapılmış olup 260.426,00 TL harcanmıştır. Proje kapsamında doğrudan temin yolu ile gerçekleştirilen işler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞİN ADI	Tarih	YUKLENİCİ FİRMA	ÖDENEN
MÜH.FAK.DEK.GİRİŞİ MERDİVEN DÜZENLENMESİNE AİT BETONARME UYG.PRJ., İİBF YAPILACAK ASANSÖR BİNASINA AİT BETONARME PRJ VE ÇELİK KONST. UYG.PRJ. VE ANAHTAR TESLİMİ KEŞİF HAZIRLANMASI, REK.KAMP.A KAPISI GÜVENLİK ODASI SEMBOL VE KULE KEMER YAPIMINA İLİŞKİN PROJESİ	02.04.12	TEK-AY MÜHENDİSLİK	38.940,00
G.Ü.TIP FAK.ARŞ VE UYG HAST.3. KAT BEYİN CER.AMELİYATHANE MİMARİ UYG.PROJESİ VE METRAJ HAZIRLANMASI İŞİ	16.05.2012	TAMA MİMARİ PROJE	11.800,00
G.Ü.KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ SAHASI JEOLÖJİK JEOTEKNİK ETÜDLERİ VE RAPOR HZ.İŞİ	29.05.2012	AKADEMİ MÜHENDİSLİK	7.080,00
G.Ü.GÖLBAŞI KAMP.YADEM İŞİNE AİT HAZIRLIK VE ETÜD ÇALIŞMALARI MİMARİ VE ÖN PROJE 3 BOYUTLU GÖRSEL TASARIMLARIN HZ.İŞİ	07.06.2012	TAMA MİMARİ PROJE	49.560,00
G.Ü MERKEZ KAMPÜSÜ A GİRİŞİ PARKI PEYZAJ PROJESİ YAPILMASI İŞİ	21.06.2012	TASARIM MÜHENDİSLİK	14.160,00
G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ YADEM MİMARİ UYGULAMA PROJESİNE AİT SİSTEM VE MONTAJ DETAYLARI TEKNİK ŞARTNAME METRAJ VE MALİYET ANALİZ HAZIRLANMASI İŞİ.	16.07.2012	TAMA MİMARİ PROJE	50.622,00
G.Ü.GÖLB.KAMP.YADEM MİMARİ UYGULAMA PROJESİ HAZIRLAMA İŞİ	16.07.2012	TAMA MİMARİ PROJE	50.504,00
G.Ü.YAPILMASI PLANLANAN HUKUK FAK.NİN 1/100 ÖLÇEĞİNDEKİ GENEL YERLEŞKE MAKETİ YAP.İŞİ	24.07.2012	MNT MİMARİ PROJE	23.600,00
G.Ü. REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ A KAPISI TASARIM İŞİ	01.08.2012	NOKTA GRUP MÜHENDİSLİK	14.160,00
TOPLAM			260.426,00

2.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler

2008H032320 numaralı projenin ödeneği ile Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı yapılması planlanmıştır. İhale bedelinin program ödeneğinin üzerinde olması sebebiyle Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yapımından vazgeçilmiştir. 1999H050070 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi iptal edilerek, 2.500.000,00-TL ödeneği bu projeye aktarılmıştır. 2012 Yılı sonuna kadar harcanamaması nedeniyle 3.000.000,00-TL Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesine aktarılmış, 9.289.303,24 TL^v yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemelerinde kullanılmıştır. Bu projedeki bütçe gerçekleşme oranı yaklaşık %98 olmuştur.

2.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

1999H050070 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje yıl içerisinde iptal edilmiş olup, proje ödeneği Eğitim Sektörü 2008H032320 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır.

2.1.4. Muhtelif İşler

2012 yılında Eğitim Sektörü 2011H032280 numaralı Muhtelif İşler projesine kapsamında makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri (gayrimaddi hak) ve yayın alımları ile Üniversitemizin binalarının büyük onarımları gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan işler aşağıdaki tabloda özet olarak belirtilmiştir.

İŞİN ADI	İŞİN ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI (TL)
Makine ve Teçhizat Alımları	500.000,00	434.766,68
Bilgi Teknolojileri	250.000,00	191.000,70
Yayın Alımları	3.200.000,00	3.182.105,82
Büyük Onarımlar	15.000.000,00	13.348.614,69 ^{vi}
TOPLAM	18.950.000,00	17.156.487,89

^v 8.945.645,29 TL'si Gazi Hastanesi ile ilgili hakediş ödemelerine aittir.

^{vi} 1.823.835,99-TL'si öz gelirden karşılanmıştır.

Makine ve teçhizat alımları kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI
MASAÜSTÜ PC VE MONİTÖR	52 ADET	BASKI	2 ADET
MASAÜSTÜ PC HP	26 ADET	ZİMBALAMA ÜNİTESİ	1 ADET
LED MONİTÖR	26 ADET	DELME ÜNİTESİ	1 ADET
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	99 ADET	KATLAMA ÜNİTESİ	1 ADET
MASAÜSTÜ PC	33 ADET	PROJEKSİYON CİH. ALIMI	20 ADET
KLAVYE	33 ADET	MEFRUŞAT ALIMI	6 KALEM
MOUSE	33 ADET	CAMLI SEHPA	7 ADET
BÜRO MEFRUŞAT ALIMI	23 KALEM	HASTA MİSAFİR KOLTUĞU	32 ADET
TEKLİ KOLTUK	6 ADET	DR ÇALIŞMA KOLTUĞU	31 ADET
İKİLİ KOLTUK	3 ADET	OTURMA GRUBU	7 TAKIM
MAKAM TAKIMI	3 TAKIM	BEKLEME KOLTUĞU	8 ADET
KAPAKLI VESTİYER	3 ADET	ÖZEL BEKLEME KOLTUĞU	8 ADET
MÜDÜR KOLTUĞU	3 ADET	MEFRUŞAT ALIMI	20 KALEM
MAKAM MASASI	1 ADET	ÇALIŞMA MASASI	10 ADET
TOPLANTI MASASI	1 ADET	KİTAPLIK	10 ADET
ETEJER	1 ADET	İLAN PANOSU	3 ADET
KONSOL	1 ADET	MASA	8 ADET
YÜKSEK KİTAPLIK	1 ADET	BÜYÜK SEHPA	8 ADET
MASA	1 TAKIM	RAFLI KİTAPLIK	8 ADET
KÜÇÜK SEHPA	1 ADET	YARIM KAPAKLI KİTAPLIK	3 ADET
TOPLANTI MASASI	1 ADET	BİLGİSAYAR MASASI	50 ADET
TEK KİLİTLİ KESON	1 ADET	ÇALIŞMA MASASI	6 ADET
MÜDÜR KOLTUĞU	1 ADET	KÜÇÜK SEHPA	4 ADET
MİSAFİR KOLTUĞU	2 ADET	KİTAPLIK	4 ADET
ŞEF KOLTUĞU	6 ADET	VOLANLI DOLAP	16 ADET
SOVALE	15 ADET	DOSYA DOLABI	16 ADET
KÜÇÜK SEHPA	15 ADET	MASA	1 ADET
BİLGİSAYAR MASASI	1 ADET	ÇALIŞMA TEZGAHI TABLASI	1 ADET
KÜÇÜK SEHPA	1 ADET	ÇALIŞMA MASASI	1 ADET
PERS.KOLTUĞU	5 ADET	ETAJER VE KESONLAR	3ADET
ÇALIŞMA MASASI	6 ADET	SOYUNMA DOLABI	3ADET
KBB ÜNİTESİ ALIMI	1 ADET	DOSYA DOLABI	5 ADET
MUAYENE ÜNİTESİ	1 ADET	KAMERA SİSTEMİ	1 ADET
HEADLIGHT ATMOS	1 ADET	KAYIT CİHAZI	1 ADET
MUAYENE KOLTUĞU	1 ADET	DIŞ MEKAN AĞ KAMERASI	4 ADET
GAZLI HEKİM TABURESİ	1 ADET	İÇ MEKAN AĞ KAMERASI	13 ADET
PROJEKSİYON ALIMI	1 ADET	LCD	2 ADET
PRİNTER VE TAMA.PARÇA ALIMI	11 ADET	SWİTCH	1 ADET
PRİNTER	2 ADET	EKRAN KARTI	1 ADET
KASET	2 ADET	KAYIT DİSKİ	2 ADET
STAND	2 ADET	NETWORK KABLOSU	400 M
PVC KANAL VE BORU	700 M		

2012 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler Bilgi Teknolojileri projesi için 250.000,00 TL başlangıç ödeneği olarak tahsis edilmiş olup, 2012 yılında ödeneğin 191.000,70 TL'si yazılım ve lisans sözleşmesi alımı için harcanmıştır.

2012 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler projesi kapsamında yayın alımları için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde Üniversitemiz likit imkanlarından 200.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 2012 yılında yayın alımları için tahsis edilen 3.200.000,00 TL ödeneğin %99,5'i (3.182.105,82 TL) harcanmıştır. 2012 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi için ayrılan ödenekten yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

HARCAMA YERİ	HARCAMA TUTARI
ABONELER	353.869,43
ELEKTRONİK VERİ TABANI	1.737.071,60
KİTAPLAR	607.846,03
E-KİTAP	412.601,36
DONANIM	70.717,40
TOPLAM	3.182.105,82

Üniversitemize ait binaların büyük onarım işleri kapsamında yapılan işleri aşağıda belirtilmiştir.

G.Ü. Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Atölye Dış Cephe Boya İle Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dış Cephe Boya ve Çatı Onarım İşi

İhale Kayıt No	2012/44653
Yaklaşık Maliyet	137.175,01
İhale Tarihi	25.04.2012
Yüklenici Firma	Özkılıçaslan Ltd.Şti.
İş Yeri Teslim Tarihi	22.06.2012
İşin Süresi	45 Gün
Sözleşme Bedeli	88.422,78

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1 Nolu Hakediş	124.362,21-TL	01.08.2012

G.Ü. Fen Fakültesi Derslik, Dekanlık ve Laboratuvar Binaları Onarım ve Tadilat İşi

İhale Kayıt No	2012/42680
Yaklaşık Maliyet	4.118.231,19-TL
İhale Tarihi	10.05.2012
Yüklenici Firma	Elif İnşaat
İş Yeri Teslim Tarihi	11.06.2012
İşin Süresi	180 Gün
Sözleşme Bedeli	2.779.171,14-TL

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1 Nolu Hakediş	504.167,53-TL	27.07.2012
2 Nolu Hakediş	532.037,55	18.09.2012
3 Nolu Hakediş	1.263.276,65	19.10.2012
4 Nolu Hakediş	328.218,02	13.12.2012
Toplam	2.627.699,75-TL	

Bu iş kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

Dekanlık Binası

- Tüm cephelerin ısı izolasyonu yapılarak betopan malzeme ile kaplanıp boyanması
- Çatı kaplama malzemesi ve ilgili aksesuarlar ile olukların yenilenmesi
- Tüm cephe pencere ve kapı doğramalarının yenilenmesi
- Mermer pencere denizliklerinin yenilenmesi
- Kuranglez içlerinin andazit doğal taş kaplama işlerinin yapılması
- Giriş kapısı yapısının yenilenerek üst bölümlerde güneş kırıcı cephe elemanı uygulaması yapılması
- Giriş kapılarının fotoselli otomatik kapı olarak düzenlenmesi

Derslik Binası

- Koridor, giriş salonu, derslikler ve merdivenlerde seamik kaplama yapılması
- Derslik ve anfilerde zemin kademelendirme işlemlerinin yapılması
- Dershane ve anfilerde kürsü platformlarının teşkil edilmesi
- Sınıfların, anfilerin ve belirtilmiş diğer hacımların iç boyalarının yapılması
- İç kapıların tadilat, tamir ve boyalarının yapıp aksesuarlarının yenilenmesi

Laboratuvar Binası

- Tüm cephelerin ısı izolasyonu yapılarak betopan malzeme ile kaplanıp boyanması
- Çatı kaplama malzemesi ve ilgili aksesuarlar ile olukların yenilenmesi
- Tüm cephe pencere ve kapı doğramalarının yenilenmesi
- Mermer pencere denizliklerinin yenilenmesi
- Çevre tretuvarlarda andazit doğal taş kaplama işlerinin yapılması
- Giriş kapısı yapısının yenilenerek üst bölümlerde güneş kırıcı cephe elemanı uygulaması yapılması
- Koridor ve merdivenlerde seamik kaplama yapılması
- Giriş kapılarının fotoselli otomatik kapı olarak düzenlenmesi

Giriş Yapısı ve Kontrol Kulübesi

- Madeni konstrüksiyon ile giriş yapısı ve kulübenin yapılması
- Giriş yapısı ve kulübe üstünün betopan malzeme ile kaplanıp boyanması
- Kulübe üzerine üniversite ambleminin teşkili
- Tüm sisteme ait elektrik güç ve aydınlatma sisteminin yapılması
- Kulübe cephelerinin giydirme alüminyum cephe alementları ile örtülerek, alüminyum giriş kapısı yapılması

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çelik Konstrüksiyon Asansör Kulesi Yapım İşi (Temel ve Subasman Hariç)

İhale Kayıt No	2012/46565
Yaklaşık Maliyet	100.469,01
İhale Tarihi	26.04.2012
Yüklenici Firma	Demas Müh.
İş Yeri Teslim Tarihi	10.07.2012
İşin Süresi	45 Gün
Sözleşme Bedeli	67.500 TL

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1 Nolu Hakediş	44.001,79	15.08.2012
2 Nolu Hakediş	36.427,44	24.09.2012
Toplam	80.429,23-TL	

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi F-K Blok Önü Çevre Düzenleme Yapılması İşi

İhale Kayıt No	2012/63865
Yaklaşık Maliyet	139.412,69
İhale Tarihi	12.06.2012
Yüklenici Firma	Eray Grup Ltd.Şti.
İş Yeri Teslim Tarihi	20.07.2012
İşin Süresi	60 Gün
Sözleşme Bedeli	98.998,00

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1 Nolu Hakediş	67.780,65	14.08.2012
2 Nolu Hakediş	47.470,40	18.09.2012
Toplam	115.251,05-TL.	

G.Ü. Gölbaşı Kampüsü Avrupa Birliği Öğrenci Değişimi Konaklama Merkezi Binaları Onarım İşi

İhale Kayıt No	2012/58802
Yaklaşık Maliyet	508.622,04
İhale Tarihi	05.06.2012
Yüklenici Firma	Ağbal İnşaat
İş Yeri Teslim Tarihi	06.07.2012
İşin Süresi	90 Gün
Sözleşme Bedeli	378.782,49

Hakediş No	Ödenen	Bütçe Tertibi	Hakediş Tarihi
1	152.777,50	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.5	31.07.2012
2	190.880,45	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.5	21.11.2012
3	188.346,44	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7	
Toplam	532.004,39		

G.Ü. Eczacılık Fakültesi Laboratuvarların Tadilat ve Onarımının Yapılması İşi

İhale Kayıt No	2012/64133
Yaklaşık Maliyet	4.119.696,09
İhale Tarihi	28.06.2012
Yüklenici Firma	Elas İnşaat
İş Yeri Teslim Tarihi	03.08.2012
İşin Süresi	180 Gün
Sözleşme Bedeli	3.999.882,23 ^{vii}

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1 Nolu Hakediş	258.439,64	14.11.2012
Toplam	258.439,64-TL.	

^{vii} 2013 Yılında (Keşif Artışı ve Sözleşme Dahil) Ödenecek Tahmini Tutar; 4.719.861,03-TL.

G.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanlık Bloğu Tadilat Giriş Düzenlemesi Yapım İşi

İhale Kayıt No	2012/64133
Yaklaşık Maliyet	555.331,24
İhale Tarihi	03.07.2012
Yüklenici Firma	Elif İnşaat
İş Yeri Teslim Tarihi	26.07.2012
İşin Süresi	60 Gün
Sözleşme Bedeli	405.132,46
Harcama Kalemi	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1	471.498,11	03.09.2012
2	59.821,11	24.12.2012
Toplam	531.319,22-TL	

G.Ü. Mühendislik Fakültesi İdari Bloklar Onarım, Dış Cephe Tadilatı Ve Çevre Tanzimi İşi

İhale Kayıt No	2011/179624
Yaklaşık Maliyet	3.049.351,38
İhale Tarihi	13.12.2011
Yüklenici Firma	Elif İnşaat
İş Yeri Teslim Tarihi	10.02.2012
İşin Süresi	90 Gün
Sözleşme Bedeli	2.390.000,00
Harcama Kalemi	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7

Hakediş No	Ödenen	Hakediş Tarihi
1	1.783.210,52	26.03.2012
2	1.595.174,60	23.05.2012
Toplam	3.378.385,12- TL	

G.Ü. Fen Fakültesi Z.09 Laboratuvar Tadilat Onarım İşi

İhale Kayıt No	2012/77374
Yaklaşık Maliyet	93.562,95
İhale Tarihi	28.06.2012
Yüklenici Firma	Altay Grup Klima San. Ve Tic. A.Ş.
İş Yeri Teslim Tarihi	07.08.2012
İşin Süresi	45 Gün
Sözleşme Bedeli	83.890,00
Harcama Kalemi	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7

Hakediş No	Ödenen	Harcama Kalemi	Hakediş Tarihi
1	94.493,33	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7	13.12.2012

2.2. Sağlık Sektörü

2.2.1. Çocuk Hastanesi Projesi

Çocuk Hastanesi Projesi 1998 yılında başlanmış bir proje olup su basmanı dahil zemin kat tamamlanmıştır. Sağlık Sektörü programından Proje kaldırılmaması için iz ödenek (1.000,00 TL) olarak verilmiştir.

2.2.2. Muhtelif İşler Projesi

2012 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Sağlık Sektörü 2010I000350 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında yapılacak bakım onarım işlerinin finansmanında kullanılmak üzere Üniversitemiz bütçesine 5.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000,00-TL. ödenek eklenmiştir. Bu proje kapsamında ulaşılan ödeneğin 6.989.575,86 TL'si harcanmıştır.

Sağlık Sektörü 2010I000350 nolu Muhtelif İşler projesinin finansmanı için Döner Sermaye'den 4.999.999,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 5.973.224,32 TL harcanmıştır. Bu tutarın 817.651,51 TL'si önceki yıllarda yapılan işe aittir.

Sağlık Sektörü 2010I000350 nolu Muhtelif İşler projesinde yapılan işler karşılığında ödenen tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI TL	
	ÖZEL BÜTÇE	DÖNER SERMAYE
G.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hast. 3. Kat Beyin Cerrahi Servisi Yapım İşİ	1.790.062,67 ^{viii}	-
G.Ü. Diş Hekimliği Fak. Engelli Kliniği Ek Bina Tadilatı Açık Ve Kapalı Otopark Yapımı ve B Blok Tadilatı ve Onarım İşİ	4.561.475,50	-

^{viii} 336.496,53 TL hibe olarak yapılmıştır.

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI TL	
	ÖZEL BÜTÇE	DÖNER SERMAYE
G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 15. Kat Yeni Doğan Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisleri Donanım ve Çocuk Kemik İligi Nakil Merkezi, 14. Kat KBB Plastik Cerrahi Servisleri 13. Kat Özel Servisi Yapım İşİ	-	710.000,00
G.Ü. Tıp Fak. Gastroentroloji Mutfak, Yemekhane, Ayaktan Cerrahi Merkezi ve Teknik Birimler ^{ix}	7.878.559,66	3.415.572,81
G.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi E Blok 7. Kat Hematoloji Servisi İkmal İşİ ve 6. Kat Göz Servisi Yapım İşİ ^x	1.067.085,63	1.030.000,00
D1/D2 Blok 2. ve 4. Katlar Tadilat ve Onarımı İşİ	-	817.651,51

G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 15. Kat Yeni Doğan Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisleri Donanım ve Çocuk Kemik İligi Nakil Merkezi, 14. Kat KBB Plastik Cerrahi Servisleri 13. Kat Özel Servisi Yapım İşİ :

- G.Ü. Hastanesi'nde 15.katta bulunan Yeni Doğan Servisi ve Çocuk Hematoloji Bölümleri yenilendi.
- Her iki serviste de zemin pvc kaplama yapıldı, tavan asma kat olarak tasarlandı ve kullanılan her malzeme antibakteriyel malzemelerden seçildi.
- Yeni Doğan kısmında yoğun bakım bölümlerinde duvar ve tavan birleşimleri yekpare halde antibakteriyel malzeme olan akrilik esaslı kaplama kullanıldı.
- Servislerde 2 kişilik ve 1 kişilik hasta odaları mevcut ve odaların wc.leri ayrı olarak kendi içerisinde tasarlandı.

^{ix} Yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemeleri yapılmıştır. (Özel Bütçe Harcamaları 09.4.1.00-2-06.5. tertibinden yapılmıştır. Söz konusu bütçe tertibi sadece Derslik ve Merkezi Birimler projesinde mevcuttur. Sağlık sektöründe 06.5 ekonomik kodu kullanılabilecek yeni proje belirlenmediğinden Derslik ve Merkezi Birimler projesinde gösterilmiştir.)

^x Yıllara sari devam etmekte olan hakediş ödemeleri yapılmıştır. (Özel Bütçe Harcamaları 09.4.1.00-2-06.5. tertibinden yapılmıştır. Söz konusu bütçe tertibi sadece Derslik ve Merkezi Birimler projesinde mevcuttur. Sağlık sektöründe 06.5 ekonomik kodu kullanılabilecek yeni proje belirlenmediğinden Derslik ve Merkezi Birimler projesinde gösterilmiştir.)

- Serviste hasta başı üniteleri ve hasta dolapları yapıldı.

G.Ü.TIP FAK. GASTROENTROLOJİ MUTFAK, YEMEKHANE, AYAKTAN CERRAHİ MERKEZİ VE TEKNİK BİRİMLER:

E Blok Zemin Kat Gastroenteroloji Servisi (Kasım/2010) :

- Gastroenteroloji Servisi Toplam Kullanım Net Alanı : 1420 M2
- 2 Adet Girişimsel Endoskopi ve Dezenfektan Odası : 72 M2
- 2 Adet Kolonoskopi ,Alet ve Dezenfektan Odası : 45 M2
- 2 Adet Motilite Alet ve Dezenfektan Odası : 42 M2
- 3 Adet Endoskopi, Alet ve Dezenfektan Odası : 67 M2
- 1 Adet Proktoloji Odası : 25 M2
- 2 Adet Ultrason Odası : 24 M2
- 1 Adet Toplantı ve Seminer Salonu : 65 M2
- 1 Adet 9 Yataklı Ayılma ve Hasta Giyinme Odası : 55 M2
- 1 Adet Laboratuvar : 32 M2
- 1 Adet Hasta Hazırlık ve Soyunma Odası : 22 M2
- 1 Adet Hemşire İstasyonu ,2 Adet Sekreteryaya ,Vezne, Klima Santral Mahalli : 135 M2
- 1 Adet Takip Polikliniği Doktor Odası, 1 Adet Personel Odası : 22 M2
- 3 Adet Takip Polikliniği Muayene Odası T : 46 M2
- 1 Adet Hasta ve Hasta Sahipleri Bekleme Salonu Koridorları : 501 M2
- 3 Grup Hasta ve Hasta Sahipleri Bay-Bayan Wc 'Ler : 75 M2
- 2 Grup Doktor ve Personel Bay-Bayan Wc 'Ler : 50 M2
- 2 Grup Doktor ve Personel Bay-Bayan Soyunma Odası : 22 M2
- Alet Depoları ,Ofis, Dahili Koridorlar Vs. : 120 M2

E Blok 1. Bodrum Kat Çocuk Poliklinikleri Servisi

- Toplam Kullanım Net Alanı : 1350 M2
- 18 Adet Çocuk Muayene Poliklinik Odası
- 4 Adet Öğretim Üyesi Odası
- 1 Adet Öğretim Üyeleri Toplantı Odası
- 2 Adet Sağlam Ve Hasta Çocuk Oyun Odası
- 1 Adet Aşı Odası

- 2 Adet Hasta Ve Sağlam Çocuk Emzirme Odası
 - 1 Adet Çocuk Alt Değişirme Odası
 - 1 Adet Kan Alma Odası
 - 2 Adet Sekreteryaya
 - 2 Grup Doktor Ve Personel Bay-Bayan Wc 'Ler
 - 4 Grup Hasta Ve Hasta Sahipleri Bay-Bayan Wc 'Ler
- E Blok 1. Bodrum Kat Biyomedikal Merkezi (Şubat/2011)

- Biyomedikal Merkez Bölümü Toplam Kullanım Net Alanı : 300 M2
- 1 Adet Merkez Müdürü Odası
- 1 Adet Sekreteryaya
- 1 Adet Cihaz Kabul Ve Depo
- 1 Adet Cihaz Kontrol Ve Egt Laboratuvarı
- 1 Adet Kalibrasyon Laboratuvarı
- 1 Adet X Işınlı Cihazlar Kalibrasyon Laboratuvarı
- 1 Adet Dokümantasyon Ve Değerlendirme Odası
- 1 Adet Araştırma Laboratuvarı
- 1 Adet Basınç Kalibrasyon Laboratuvarı
- 1 Adet Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı
- 1 Adet Pipet Kalibrasyon Laboratuvarı
- 1 Adet Depo
- 2 Grup Personel Bay-Bayan Wc 'Ler

E BLOK 1. BODRUM TEKNİK SERVİS MERKEZ DEPARTMANI (Şubat/2011) :

- TEKNİK SERVİS MERKEZ BÖLÜMÜ TOPLAM KULLANIM NET ALANI : 350 M2
- 1 ADET Teknik Servis Amir Odası
- 1 ADET Sekreteryaya
- 1 ADET Baş Teknisyen Odası
- 2 ADET Baş Teknisyen Yardımcıları Odası
- 1 ADET Proje Ofisi
- 1 ADET Depo ve Arşiv
- 1 ADET Tıbbi Cihaz Atölyesi
- 1 ADET Elektrik Atölyesi

- 1 ADET Elektronik Atölyesi
- 1 ADET Klima Cihaz Atölyesi
- 1 ADET Tıbbi Medikal Gaz Atölyesi
- 2 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER

E BLOK 1. BODRUM KAT ECZANE MERKEZ DEPARTMANI (Şubat/2011)

- ECZANE BÖLÜMÜ TOPLAM KULLANIM NET ALANI : 350 M2
- 1 ADET Eczane Sorumlu Odası
- 1 ADET Özel İlaç Hazırlama Laboratuvarı
- 1 ADET İlaç dağıtım Bölümü
- 1 ADET Depo ve İlaç tasnif Odası
- ADET Eczane ilaç Kayıt Bürosu
- 1 ADET Soyunma Odası
- PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER

E BLOK 2. BODRUM MORG/MESCİT BÖLÜMLERİ (Ocak/2011)

- MORG/MESCİT BÖLÜMLERİ TOPLAM KULLANIM ALANI : 450 M2
- 1 ADET Morg Görevlisi Odası
- 1 ADET Bay İmamlar Odası
- 1 ADET Bayan İmam Odası
- 1 ADET Savcı Odası
- 1 ADET Otopsi Salonu
- 1 ADET 42 cenazelik Morg Deposu
- 1 ADET Soyunma ve Duş
- 1 ADET Depo
- 1 ADET Bay Gasilhane
- 1 ADET Bayan Gasilhane
- 2 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER
- 1 ADET Bay Mescit Odası
- 1 ADET Bayan Mescit Odası

- 1 ADET Bay Abdesthane ve WC
- 1 ADET Bayan Abdesthane ve WC

E BLOK 2. BODRUM ECZANE DEPO BÖLÜMÜ (Ocak/2011)

- ECZANE VE TPN DEPO BÖLÜMLERİ TOPLAM KULLANIM ALANI : 570 M2
- 1 ADET Alkol Deposu
- 1 ADET İdari Ofis
- 1 ADET +4 derece Soğuk Depo
- 1 ADET -18 derece Soğuk Depo
- 1 ADET Büyük ilaç deposu
- 1 ADET TPN Deposu
- 1 ADET TPN İlaç Hazırlama temiz Odası

E BLOK 2. BODRUM GENEL DEPO BÖLÜMÜ (Mart/2011)

- GENEL DEPO BÖLÜMLERİ TOPLAM KULLANIM ALANI : 500 M2
- 1 ADET Genel Depo Mahalli
- 1 ADET İdari depo sorumlusu Ofisi
- 2 ADET +4 derece Soğuk Depo

E BLOK 2. BODRUM TEKNİK SERVİS ATÖLYELERİ VE TEKNİK BİRİMLER BÖLÜMÜ (Şubat/2011)

- TEKNİK SERVİS BÖLÜMLERİ TOPLAM KULLANIM ALANI : 800 M2
- 1 ADET Teknik Servis Nöbetçi teknisyen Odası
- 1 ADET Marangoz Atölyesi
- 1 ADET Boya Atölyesi
- 2 ADET Bobinaj-Motor Atölyesi
- 1 ADET Döşeme Atölyesi
- 1 ADET Sıhhi Tesisat-Kaynak Atölyesi
- 1 ADET Soyunma Odası

- 1 ADET Medikal Gaz Oksijen santrali
- 1 ADET Medikal Gaz Vakum-Azot santrali
- 1 ADET Klima santrali
- 1 ADET Merkezi Eşanjör Dairesi
- 2 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER

TEKNİK BİRİMLER İDARİ OFİSLERİ (Saymanlık / Satınalma Bölümleri) (Mayıs/2011)

- Saymanlık Müdürlüğü Bölümü : 425 M2
- Satınalma Müdürlüğü Bölümü : 975 M2 (İhale Odası/ Sivil Savunma/ Tahakkuk/ Performans dahil)

E BLOK 8.KAT AYAKTAN CERRAHİ MERKEZİ - YOĞUN BAKIM-HASTA ODALARI

- AYAKTAN CERRAHİ MERKEZİ-YOĞUN BAKIM-HASTA ODALARI: (Brüt:3200 M2)
- 4 ADET Ameliyat Salonu
- 1 ADET 4 Yataklı Yoğun Bakım Odası
- 1 ADET Ayılma Odası
- 2 ADET Bobinaj-Motor Atölyesi
- 1 ADET Döşeme Atölyesi
- 1 ADET Sıhhi Tesisat-Kaynak Atölyesi
- 1 ADET Soyunma Odası
- 1 ADET Medikal Gaz Oksijen santrali
- 1 ADET Medikal Gaz Vakum-Azot santrali
- 1 ADET Klima santrali
- 1 ADET Merkezi Eşanjör Dairesi

• E BLOK 8.KAT ÇOCUK YOĞUN BAKIM VE HASTA ODALARI

- ÇOCUK YOĞUN BAKIM VE HASTA ODALARI ; (675M2)
- 1 ADET 9 Yataklı Yoğun Bakım / Hemşire-ilaç hazırlama Odası
- 1 ADET Görüşme ve Toplantı Odası

- 2 ADET Doktor Odası
- 1 ADET Asistan Odası
- 1 ADET Hemşire Ofisi-ilaç hazırlama Odası
- 1 ADET Sekreteryaya Odası
- 1 ADET Ofis / Yemek dağıtım Odası
- 7 ADET Tek Kişilik Hasta Odası/müstakil duş-WC 'li
- 2 ADET İki Kişilik Hasta Odası/müstakil duş-WC 'li
- 2 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER

E BLOK 8.KAT HASTA YATAKLI SERVİS

- HASTA YATAKLI SERVİS ; (675M2)
- 9 ADET Tek Kişilik Hasta Odası/müstakil duş-WC 'li
- 4 ADET İki Kişilik Hasta Odası/müstakil duş-WC 'li
- 1 ADET Doktor Odası
- 1 ADET Hemşire Ofisi-ilaç hazırlama Odası
- 1 ADET Sekreteryaya Odası
- 1 ADET Ofis / Yemek dağıtım Odası
- 2 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER
- 2 GRUP Hasta Sahipleri BAY-BAYAN WC 'LER

• E BLOK 8.KAT TEKNİK BİRİMLER

- TEKNİK BİRİMLER ; (325M2)
- 1 ADET Merkezi Klima Santral Odası
- 1 ADET Güvenlik / CCTV Kontrol ve izleme odası
- 1 ADET Elk.Data ve IT Pano teknik Odası

E BLOK 10.KAT MUTFAK VE YEMEKHANELER

- 10.KAT MUTFAK VE YEMEKHANELER : (Brüt:3200 M2)
- 1 ADET 50 Kişilik VİP Yemek salonu
- 1 ADET 700 Kişilik Öğretim Üyeleri Yemek Salonu

- 1 ADET 64 Kişilik Mutfak Personeli yemek salonu
- 4 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER
- Soğuk Odalar,alakart Mutfağı,vs.

E BLOK 11.KAT MUTFAK VE YEMEKHANELER

- 11.KAT MUTFAK VE YEMEKHANELER : (Brüt:3200 M2)
- 1 ADET 1150 Kişilik personel Yemek salonu
- 1 ADET 200 Kişilik Dr.+Hemşire Yemek Salonu
- 4 GRUP PERSONEL BAY-BAYAN WC 'LER
- Soğuk Odalar,Yemek dağıtım,pişirme bölümleri,mutfak müştemilatı,vs.

G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ E BLOK 7. KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ İKMAL İŞİ VE 6. KAT GÖZ SERVİSİ YAPIM İŞİ :

1. İhale kapsamındaki 7. Kat Hematoloji Servisi İkmal işi imalatlarına ait tüm birimler projeye uygun olarak 24.04.2012 tarihinde tamamlanarak kullanıcılara teslim edilmiştir.
2. E Blok 6. kat Göz Servisi İş kapsamında İdare tarafından bölüm değişikliği yapıldığından proje çalışmaları devam etmekte olup bu katda halen imatlara başlanamamıştır.

2012 YILINDA BÜYÜK ONARIM PROJESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞRUDAN TEMİNLER

1. G.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA SUNDURMA YAPILMASI VE 40*60 PROFİL VE 40*40 PROFİL ÜZERİNE OSB ŞİNGİL YAPILMASI İŞİ
2. G.Ü OSTİM MESLEK YÜKSEKOKULU KAZAN DAİRESİ TADİLAT İŞİ
3. G.Ü TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. KAT DERSLİK, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. KAT LABORATUVAR TADİLAT VE ONARIM İŞİ
4. G.Ü GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ L BLOK BODRUM KAT TADİLAT VE ONARIM İŞİ
5. G.Ü BÖLBAŞI GCP KLİNİĞİ DIŞ CEPHE ISI YALITIMI YAPIM İŞİ
6. G.Ü BÖLBAŞI YADEM C BLOK 1,2,3 NOLU ODALARIN TADİLAT İŞİ

7. G.Ü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AMFİ 1 DE BULUNAN SİRALARIN TAMİRİNİN YAPILMASI İŞİ
8. G.Ü GÖLBAŞI YADEM C BLOK 4,5,7 NOLU ODALARIN TADİLAT İŞİ
9. G.U MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KANAL VE TESİSAT YENİLENMESİ İŞİ
10. REKTÖRLÜK BİNASI FEN FAK. 3. KAT OKUMA SALONUNUN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ODASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
11. MÜH.MİM.FAK.GİRİŞ KAPILARI HAVA PERDESİ TAKILMASI İŞİ
12. İİBF. YANAN PANONUN YENİLENMESİ VE GÜVENLİK KULÜBELERİNE ENERJİ ÇEKİLMESİ İŞİ
13. TIP FAK.DEKANLIK BİNASI DERSLİK ODA VE KORİDOR TADİLAT YAPILMASI İŞİ
14. GÖLBAŞI YADEM C BLOK GCP KLİNİĞİ 1,2,3 NOLU ODALARIN TADİLATI İŞİ
15. GÜZEL SAN.FAK.ZEMİN KAT ODA TADİVE ONARIM İŞİ
16. AKYURT ATATÜRK MYO.YIKILAN BİNANIN ÇEVRE DÜZENİ VE ÇUBUĞA TAŞINMASI
17. İLETİŞİM FAK.DEKANLIK KATI BOYANMASI VE KALORİFER TAD.ON.İŞİ
18. HUKUK FAK.B1,D1 BLOK CAM MOZAİK KAPLAMA İŞİ
19. İLETİŞİM FAK.BODRUM KAT VE BAHÇE, TEK.FAK.B BLOK ODA VE GÖLBAŞI KAMP.VİP SALONU ONARIMI İŞİ
20. GAZİ EĞT.FAK.L BLOK BODRUM KAT WC ONARIM İŞİ
21. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.ELKT.MÜH.BÖLÜMÜ BİNASI SAĞ YAN VE ARKA CEPHE PVC VE PENCERE DOĞRAMASI YAPILMASI İŞİ
22. TEKNİK EĞİTİM FAK. A BLOK KAZAN DAİ.TAD.ONR.İŞİ
23. ÇUBUK YERLEŞKESİ ATATÜRK MYO.LAB.TAD.İŞİ
24. REKTÖRLÜK AYDINLATMA VE HASTANE SAYAÇ TAKILMASI İŞİ
25. G.Ü.GÖLBAŞI YADEM C BLOK GCP KLİNİĞİ 5,6,7,8 NOLU ODALARIN TAD.İŞİ
26. G.Ü.HASTANESİ E BLOK HEMATOLOJİ KAZAN DAİRESİNE DOĞALGAZ KOLON HATTI ÇEKİLMESİ İŞİ
27. G.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.1. KAT 11 NOLU DERSLİĞİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
28. G.Ü.MERKEZ KAMP.ÖĞRENCİ KONSEYİ DAİRESİ L BLOK BODRUM KAT KORİDOR ONARIM İŞİ

29. G.Ü.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KANALİZASYON İŞİ
30. G.Ü.GÖLBAŞI YADEM C BLOK ZEMİN KAT KORİDOR VE WC LERİN TADİLAT İŞİ
31. G.Ü.REKTÖRLÜK A KAPISI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
32. GÖLBAŞI YADEM C BLOK GCP KLİNİĞİ ZEMİN KAT KORİDOR VE WC LERİN TADİLAT İŞİ
33. G.Ü. GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ VİP SALONU AHŞAP MOBİLYA VE DOLAP İŞİ
34. G.Ü. ÇUBUK KAMP. AYDINLATMA ARMATÜRLERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ
35. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ MATBAA YENİ ARŞİV BÖLÜNMESİ İŞİ
36. TIP FAK.5.KAT DERSLİKLERİ SIRA YAPIM İŞİ
37. G.Ü.BEDEN EĞİTİMİ Y.OKULU KAPALI SPOR SALONU ERKEK DUŞ VE SOYUNMA OEDASI ONARIM İŞİ
38. G.Ü.BEYPAZARI TEK.BİL.MYO.BİLGİSAYAR ODASI TADİLAT VE TEKNOLOJİ FAK.ÖĞRT.GÖREVLİLERİ BİNASI VE ATÖLYE BİNASI DIŞ CEPHE BOYASI İŞİ
39. G.Ü.FEN FAKÜLTESİ 1600 KVA TRAFOSUNDAN 1600 KVA KÜTÜPHANE ENERJİ MERKEZİ TRAFOSUNA DEPLASE İŞİ
40. G.Ü.GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ K BLOK WC YAPIM İŞİ
41. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ İDARİ HİZMET BİNALARI DIŞ CEPHE ISI KAPLAMA İŞİİ
42. G.Ü.BEDEN EĞİTİMİ Y.O.KAPALI SPOR SALONU BAYAN DUŞ VE SOYUNMA ODASI ONARIM İŞİ
43. G.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DOĞALGAZ ALTYAPI SERVİS HATTI YAPIM İŞİ
44. G.Ü.MERKEZ KAMPÜS A KAPISI GİRİŞ KULESİ FORE KAZIK VE RADYE TEMELİ YAPILMASI İŞİ
45. G.Ü.YADEM BİNASI VE GCP KLİNİĞİ BİNASI DIŞ CEPHE BOYASI
46. G.Ü.REKTÖRLÜK YAPI İŞLERİ KAMERA SİSTEMİ, OSTİM MYO.ELEKTRİK VE TELEFON, MEF.KAMERA SİSTEMİ KABLO VE KABLO KANALI YAPIM İŞİ
47. G.Ü.MÜHENDİSLİK FAK.YAZI TAHTASI YAPILMASI İŞİ
48. G.Ü.HUKUK FAK.KAMERA SİSTEMİ TAKILMASI YAPIM İŞİ
49. G.Ü.YADEM BİNASI DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ

50. G.Ü.END.SAN.FAK.VE KOLAKLAMA TESİSİ ÇATI ONARIMI
51. GÜ.İ.İ.B.F.İDARİ BİNA ARKASI ASANSÖR TEMEL BETONARMESİ VE REKTÖRLÜK MRK.KAMPÜSÜ A KAPISI DÜZENLEME İŞİ
52. G.Ü.GAZİ HASTANESİ D BLOK 1.BODRUM KAT İLE 4. KAT ASANSÖR KOVALARININ KULLANIM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
53. G.Ü.REKTÖRLÜK BAHÇESİ HAVUZ MEBRAN TADİLATI
54. G.Ü.REKTÖRLÜK BİNASI DIŞ CEPHE KAPI VE PENCERE DOĞRAMALARININ BOYANMASI İŞİ
55. G.Ü.KAMPÜSÜ YADEM A BLOK ÖĞRENCİ GİRİŞİ ÖN VE ARKA CEPHE MANTOLAMA İŞİ
56. G.Ü.MÜH.FAK.1. VE 2.KATLAR BULUNAN ANFİ VE SINIFLARDAKİ MOTORLU PERDE İMALATLARININ YAPILMASI İŞİ
57. G.Ü.TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA BİRİMİ ALKOL TEDAVİ MRK.ISI YALITIMI İŞİ
58. G.Ü.GÖLBAŞI PSİKİYATRİ TEDAVİ MERKEZİ CEPHE MANTOLAMA YAPIM İŞİ
59. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPSÜNDE İNŞAASI PLANLANAN YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ İNŞAAT ALANININ ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ
60. G.Ü.FEN FAK.LAB.BİNASI 1. KAT CAM MALZEME ODASINA LAB.TEZGAHI YAPILMASI İŞİ
61. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.DEKANLIK BİNASI ÖNYOL KENARI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
62. G.Ü.GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ GİRİŞ KAT HOLÜ, 1. KAT VİP SALONU VE GİRİŞ KAT HOLÜ DEKORASYON VE TADİLAT İŞİ
63. G.Ü.TIP FAKÜLTESİ ACİL GİRİŞİ VE BİM ODALARI TAD.İŞİ
64. G.Ü.TIP FAK.ACİL SERVİS GİRİŞİ MARKİZİ ACİL TABELASI VE YÖNLENDİRME LEVHALARI YAPIM İŞİ
65. G.Ü.BESYO HALI SAHA YANI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
66. G.Ü.ÇUBUK ATATÜRK MYO. SINIF KAPILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
67. G.Ü.İİBF.ANFİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ
68. G.Ü.BESYO KAPALI SPOR SALONU ÖĞR.ÜYESİ BAYAN DUŞ VE SOYUNMA ODASI ONARIM İŞİ

69. G.Ü.GÖLBAŞI YERLEŞKESİ TRAFOSU BETONARME KABLOSU KANALI ELEKTRİK TESİSAT İŞİ
70. G.Ü.FEN FAK.LAB.BİNASI 1. KAT 121 NOLU MALZEME ODASINA LAB.DOLAPLARI İLE ÇEKER OCAK YAPILMASI İŞİ
71. G.Ü.MÜH VE MİM. FAK.İLAN YAYINLARI VE PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK YAPIM İŞİ
72. BESYO KAPALI SPOR SALONU BAY ÖĞRETİM ÜYESİ DUŞ VE SOYUNMA ODASI ONARIM İŞİ
73. GÜ GÖLBAŞI KONFERANS SALONU CEPHE KAPLAMA İŞİ
74. GÜ.Ü GÖLBAŞI SOSYAL TESİSİ 1.KAT BAYAN WC 2.KAT BAY WC TAD.ONARIM İŞİ
75. G.Ü.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2.KAT TADİLAT ONARIM İŞİ
76. G.Ü.ECZACILIK FAK.KALORİFER VE TEMİZ SU BORULARI DEĞİŞİMİ İŞİ
77. G.Ü.REKTÖRLÜK A KAPISI ÖNÜ DOLUNAY PARKI ETRAFI KALDIRIMLARININ GERİ ÇEKİLMESİ İŞİ
78. G.Ü.FEN FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.LABORATUVAR TEZGAHI VE AHŞAP DOLAP YAPIM İŞİ
79. G.Ü.OSTİM MYO.1.KAT WC VE 113 NOLU ODA 2. KAT TADİLAT ONARIM İŞİ
80. G.Ü.FEN EDEBİYAT FAK.MİKROTEKNİK LAB.LABORATUVAR TEZGAHI VE AHŞAP DOLAPLARI YAPIMI İLE OKUMA SALONU DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI İŞİ
81. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ HİZMET BİNASI DEĞİŞİM MERKEZİ DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ
82. G.Ü.GÖLBAŞI YADEM A BLOK SOL YAN CEPHE YALITIM İŞİ
83. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ HİZMET BİNASI YEMEKHANE BLOKLARININ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM MERKEZİ DIŞ CEPHE ISI YALITIM İŞİ
84. G.Ü.MERKEZ KAMPÜS HİZMET BİNASI (ESKİ LOJMAN) 2.KAT TADİLAT İŞİ
85. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ LAP.CERRAHİ BİNASI ÇATI ONARIMI İŞİ
86. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.YAPI BÖLÜMÜ ATÖLYE DIŞ CEPHE BOYA TAD.İŞİ İLE KOSGEB-TEK-MER KANALİZASYON İŞİ
87. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ KANALİZASYON YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

88. G.Ü.FEN FAKÜLTESİ DERSLİKLER BİNASI ETRAFI ANDEZİT TAŞ KAPLAMA, TRETUAR YAPIM İŞİ
89. G.Ü.MÜHENDİSLİK FAK.VE MİM FAK.CEPHE VE ÇEVRE AYDINLATMA İŞİ
90. G.Ü.GÖLBAŞI YADEM A BLOK ÖĞRENCİ BLOĞU SAĞ YAN CEPHE ISI YALITIM YAPIM İŞİ
91. G.Ü.SELİM SIRRI SPOR SALONU SAĞ YAN CEPHE BOYA HASTANE OTOPARKI REFÜJ DÜZENLEMESİ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSİ GİRİŞİ ANDEZİT KAPLAMA İŞİ
92. G.Ü.REKTÖRLÜK ÇELİK KONSTRİKSİYON GİRİŞ KULESİ YAPIM İŞİ
93. G.Ü.LAP.CERRAHİ BİNASI TRETUVAR VE DUVAR KAPLAMA İŞİ
94. G.Ü.BESYO FUTBOL SAHASI TRİBÜN ARKASI VE SELİM SIRRI SPOR SALONU ÖN SOL YAN VE ARKA CEPHELER BOYA VE ONARIM İŞİ
95. G.Ü.MERKEZ KAMPÜS İÇİ YOLLAR TAŞ KAPLAMA SÖKÜP TAKMA VE YENİLEME İŞİ
96. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.FUTBOL SAHASI ASFALT YOL CEPHESİ TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
97. G.Ü.GAZİ EĞİTİM FAK.KONSER SALONU GİRİŞ YOL KENARINA İSTİNAT DUVARI YAPILMASI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
98. G.Ü.GÖLBAŞI YERLEŞKESİ SAĞLIK KURULU BİNASI SAĞ yan cephe ısı yalıtımı işi
99. G.Ü.GÖLBAŞI PSİKİYATRİ İDARİ MERKEZİ DIŞ CEPHE ISI YALITIMI İŞİ
100. G.Ü.GÖLBAŞI YERLEŞKESİ SAĞLIK KURULU BİNASI SOL YAN DIŞ CEPHE ISI YALITIMI İŞİ
101. G.Ü.TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
102. G.U GÖLBAŞI YERLEŞKESİ ANA TRAFO YENİLEME BETON DİREK DEMONTAJ İŞİ
103. G.U BESYO MAVİ SALON SPOR SALONU OYUNCU ÇIKIŞ TARAFI SALON AHŞAP ZEMİN YENİLEME İŞİ
104. G.U TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KÜLTÜR MERKEZİ ANA YOL DUVARI TRAVERTEN TAŞ KAPLAMA İLE REKTÖRLÜK BİNASI ÖN ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
105. G.U REKTÖRLÜK AÇIK OTOPARK DÜZENLEME VE GENİŞLETME İŞİ

106. G.U GAZİ HASTANESİ REÇETE ONAY YANI SİSTEM ODASI DATA TESİSATI DÜZENLEME İŞİ
107. G.U İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SINIFI ONARIM İŞİ
108. G.U TEK. FAK.DEKANLIK YOLU ÇEVRE DÜZENLEME VE ELEKTRİK TESİSATI YAPIMI TALAŞLI ÜRETİM BÖLÜMÜ YAĞMUR SUYU DRENAJ YAPIM İŞİ İLE FEN FAK. DERSLİKLER BİNASI BETON TAŞ KAPLAMA İŞİ
109. G.U TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÜÇÜNCÜ KAT BEYİN CERRAHİ SERVİSİ TAŞIYICI SİSTEM GÜÇLENDİRME STATİK UYGULAMA MEDİKO SOSYAL ASANSÖR BİNASI BETON ARME ÇELİK KONSTRÜKSİYON İLE BİRİNCİ KAT GÜÇLENDİRME PROJELERİ HAZIRLANMASI YAPIM İŞİ
110. G.U GÖLBAŞI MATBAA HAVALANDIRMA TESİSAT YAPILMASI İŞİ
111. G.U MEDİKO SOSYAL BİNASI B BLOK 2. KAT WC VE ZEMİN KAPLAMA TADİLAT İŞİ
112. G.U FEN FAKÜLTESİ DERSLİK DEKANLIK VE LABORATUAR BİNALARI ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
113. G.Ü HASTANESİ E BLOK MUTFAK SAYAÇ GRUPLARI MONTAJ İŞİ
114. G.Ü REKTÖRLÜĞÜ BEŞEVLER KAMPÜSÜ A KAPISI GİRİŞ KULE YAPILMASI İŞİ
115. G.Ü REKTÖRLÜK FEN FAKÜLTESİ ÇEVRE AYDINLATMA İŞİ
116. G.Ü FEN FAKÜLTESİ DERSLİK BLOĞU ÖN GİRİŞ KAPISI VE ÖĞRENCİ İŞLERİ SERVİS BÖLMESİ YAPILMASI İŞİ
117. G.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA LAB. SOĞUTMA GRUBU YAPIM İŞİ
118. G.Ü. MEDİKO SOSYAL BİNASI 1.KAT DOKTOR ODALARI BOYA VE TAD. İŞİ
119. G.Ü. F BLOK MERDİVEN GİRİŞ MARKİS YALITIM YAPILMASI İŞİ
120. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ. BŞK.1.KAT WC TAD.VE ONARIM İŞİ
121. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.İNŞ.MÜH.BÖL.KARGİR ATÖLYESİ DERSLİK ALÜMİNYUM BÖLME MALZEME LABARATUVARINA ALÜMİNYUM KAPI YAP.İŞİ.
122. G.Ü.DİŞ HEK.FAK.B BLOK 2.KAT ISI YALITIMI ALÜM.PENCERE DOĞ.DEĞİŞİMİ VE YAP.İŞİ
123. G.Ü BEYİN CERRAHİ BÖL. AMELİYATHANESİ MEKANİK PROJE METRAJ KEŞİF ŞARTNAME VE ANALİZLERİNİN YAP.İŞİ

124. G.Ü.F BLOK ZEMİN 1-2-3 KATLAR TADİLAT ONARIMI VE ÇOK AMAÇLI SALON İLAVE İŞLERİ ELEKTİRİK TESİSATI YAP.İŞİ
125. G.Ü. MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÇATI ONR.
126. GÜ.G.E.F C-D BLOKLAR ARASI GİRİŞ YOLU VE RESİM İŞ BÖLÜMÜ ÖN CEPHE YOLU TAŞ KAPLAMA İŞİ
127. G.Ü. TEKNOLOJİ FAK.B BLOK ARASI KANTİN BİNASI TEMELİ VE TRETUVARI SÖKÜMÜ İLE SÖKÜLEN YERE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ.
128. G.Ü.BEDEN EĞİTİMİ Y.O.KAPALI SPOR SALONU KORİDORLARI ONR.İŞİ
129. G.Ü.MÜH.FAK.MİM.FAK.ÖĞRENCİ DANIŞMA BANKOSU,307 NOLU SINIFA DUVAR PANOSU YAP.İŞİ.
130. G.Ü.MÜH.FAK DEKANLIK MEVCUT GİRİŞ KAPILARININ ÇİFT AÇILIR OTOMATİK KAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ.
131. G.Ü.F BLOK KONFERANS SALONU SES GÖRÜNTÜ SİS.YAP.İŞİ.
132. G.Ü. F BLOK KONFERANS SALONU TEFRİŞATI YAP.İŞİ.
133. G.Ü.TIP FAK.BİLGİ İŞLEM VE REÇETE ONAY YANI DAĞITIM NOKTASI YAP.İŞİ
134. G.Ü.TIP FAK.ACİL SERVİS 2.KAT BATI CEPHESİ 21*3 METRE EBATLARINDA IŞIKLI TABELA YAP.İŞİ
135. G.Ü. GÖLB.YADEM SINIF BÖLME YAP.İŞİ.
136. G.Ü. TEKNOLOJİ FAK.ELEKT.MÜH. A BİNASI E BLOK 1.KAT BİLG.MÜH.1.KAT SANAT VE TASARIM FAK.1.KAT REKTÖRLÜK ZEMİN KAT HUKUK MÜŞV.ODALARININ TADİLAT VE ONR.İŞİ.
137. G.Ü.TIP FAK ACİL SERVİS TERAS KAT KUZEY CEPHESİ 8*3 M.EBATLARINDA IŞIKLI LOGO VE TABELA YAP.İŞİ.
138. G.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZEMİN KAT BİLG.LABR.SABİT MASA İMALATI VE YERİNE MONTAJI İŞİ .
139. G.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4.KATTA BULUNAN AMFİ VE SINIFLARDAKİ MOTORLU PERDE İMALATLARININ YAP.İŞİ.
140. GAZİ HASTANESİ D BLOK 5-6.KAT ARASI ASANSÖR KOVALARININ KULLANIM ALANINA DÖN.İLE 5.KAT LABR. GİRİŞ DÜZ.İŞİ.
141. G.Ü.FEN FAK. LAB. BİNASI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEĞİŞİM İŞİ
142. G.Ü. HUKUK FAK. BAHÇE DÜZENLEME İŞİ

143. G.Ü. GÖLBAŞI ALKOL TEDAVİ MERKEZİ DIŞ TRETUAR YAPIM İŞİ
144. G.Ü. OSTİM MYO 1.KAT ODALARINA LAMİNANT KAPLAMA DÖŞEME YAPILMASI İŞİ
145. G.Ü.TIP FAK.ARŞ.UYG.HASTANESİ POLİKLİNİK BİNASI ZEMİN KAT ACİL SERVİS, ZEMİN KAT POLK. DATA KABLOLARI FİBER OPTİK KABLOLARININ YENİLENMESİ İŞİ
146. MERKEZ KAMPÜSHİZMET BİNASI (ESKİ LOJMAN) 2. KAT MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU OFİSİ TAD.ONARIM, 3. KAT MERDİVEN KOVASINA ALM.BÖLME YAPILMASI, GUDAK DIŞ DEPO YAPILMASI İŞİ
147. BESYO MAVİ SAPO SALONU TRÜBÜN ÖNÜ SALON AHŞAP ZEMİN YENİLEME İŞİ
148. REKTÖRLÜK D GİRİŞ KAPISI YANI OTOPARK DÜZENLEME İŞİ
149. TIP FAK.HASTANESİ POLK BİNASI 1. KAT , 2. KAT VE 4. KAT ACİL SERVİS DATA KABLOLARI VE FİBER OPTİK KABLOLARININ YENİLENMESİ İŞİ
150. MERKEZ KAMPÜS A KAPISI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BARİYER SİSTEMLERİ İLE GAZİ HASTANESİ OTOPARKI GİRİŞ-ÇIKIŞ VE ZİYARETÇİ ÇIKIŞ NOKTALARI BARİYER SİSTEMLERİ, MANUEL ÇELİK KAPAN SİSTEMİ YAPILMASI İŞİ
151. G.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK BİNASI İÇAVLU CEPHE VE PENCERE BOYAMA İŞİ
152. G.Ü.GÖLBAŞI MEDİKO BİNASI EŞANJÖR TESİSATI YAPIM İŞİ
153. G.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ F-K BLOK ÖNÜ ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI İŞİ
154. G.Ü.REKTÖRLÜK BİNASI İÇAVLU PENCERE TAKILMASI İŞİ
155. G.Ü.REKTÖRLÜK BİNASI İÇAVLU CEPHE BOYANMASI İŞİ
156. G.Ü.İLETİŞİM FAKÜLTESİ İÇ MAHALLER BOYA VE TADİLAT İŞİ
157. G.Ü.TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS 1.KAT, 2. KAT VE 3. KATLAR DATA KABLOLARI VE FİBER OPTİK KABLOLARININ YENİLENMESİ İŞİ
158. G.Ü.İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK TADİLAT İŞİ
159. GÖLBAŞI KAMPÜSÜ SANAT TASARIM Z-2, BZK-14, B109, BİLGİSAYAR LAB. ELEKTRİK İŞİ
160. GAZİ HASTANESİ VE ÇAYYOLU SEMT POLİKLİNİĞİ TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ÖLÇÜM RAPORLANMASI İŞİ

161. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAK.ALÜMİNYUM LEVHALARLA KENETLİ ÇATI KAPLAMA İŞİ
162. GÖLBAŞI KAMPÜSÜ SANAT TASARIM FAK. SINIF VE OFİSLERİNİN ELEKTRİK TADİLAT İŞİ
163. G.Ü.GÖLBAŞI KAMPÜSÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ DATA VE TELEFON SİSTEMİ ELEKTRİK TADİLAT İŞİ
164. G.Ü.TRAFOLARI VE ENERJİ MERKEZLERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ BAKIM İŞİ
165. G.Ü.SANAT TASARIM FAKÜLTESİ TADİLAT VE ONARIM İŞİ
166. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ D BLOK ÇATI SAÇ OLUKLARI VE İÇ MAHALLER BOYA İŞİ
167. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KAZAN DAİRESİ YAPIM İŞİ
168. POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAZAN BAKIM İŞİ
169. ECZACILIK FAKÜLTESİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜ DEĞİŞİMİ VE BAKIM ONARIM İŞİ
170. HASTANE SAYMANLIK BÖLÜMÜNE ŞEF ODASI VE KORİDORA BÖLME YAPILMASI İŞİ
171. G.Ü.HUKUK FAK.BAHÇESİ İLAVE DUVAR ÜSTÜ VE AĞAÇ ÇEVRESİ AHŞAP OTURMA BİRİMLERİ YAPILMASI İŞİ
172. OSTİM MYO.VE MESLEKİ EĞİTİM FAK.NE AİT BİNA KANALİZASYON GİDERLERİNİN TEMİZLENMESİ İŞİ
173. G.Ü. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ C BLOK GİRİŞ KAPISI KAYAR KAPI YAPIM İŞİ
174. G.Ü.REKTÖRLÜK BİNASI İLAVE KLİMA YAPIM İŞİ
175. G.Ü. GÜZEL SANATLAR FAK.KABLO YENİLEME KONTROL ÜNİTESİ VE JENERATÖR BAKIM İŞİ
176. G.Ü. FEN FAKÜLTESİ 121-122 Z-21-22 NOLU LABLAR VE DERSLİK ASİSTAN ODALARI MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ
177. G.Ü. REKTÖRLÜK A KAPISI VE HUKUK FAKÜLTESİ KLİMA MONTAJI İŞİ
178. G.Ü. REKTÖRLÜK MİMAR KEMALETTİN KONFERANS SALONU KOLTUK TAMİRİ WC KAPILARINA KOLLUK VE TEKMELİK YAPILMASI VE AHŞAP KAPI YAPILMASI İŞİ

179. G.Ü. BEYPAZARI MYO BİLGİSAYAR LABORATUARI ELEKTRİK VE DATA TESİSATI
180. G.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DATA TELEFON TESİSATI DÜZENLEME İŞİ
181. G.Ü. GÖLBAŞI MEDİKO BİNASI (DOĞU CEPHESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ)
182. G.Ü. GÖLBAŞI MEDİKO BİNASI BATI CEPHESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
183. B BLOK ÖĞRENCİ İŞLERİ MERDİVEN KOVASI ZEMİN KAPLAMA VE ELEKTRİK İŞLERİ
184. A KAPISI GÜVENLİK İÇ MAHAL DÜZENLENMESİ İŞİ
185. G.Ü.REKTÖRLÜK BİNASI 1.KAT MAKAM ODA VE KORİDORLAR BOYA İŞİ
186. G.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK BİNA İÇ MAHALLER BOYA VE ELEKTRİK İŞLERİ
187. G.Ü.HASTANESİ MÜŞTEMİLAT ARMATÜR DEĞİŞİM İŞİ
188. G.Ü.MERKEZ KAMPÜS MÜZİK BÖLÜMÜ KREŞ VE KİREVİ BORUHATTI YENİLENMESİ İŞİ
189. TEKNİK EĞİTİM FAK.FUTBOL SAHASI ALTINDAN GEÇEN 170 MT.100 ÇİFT TELEFON KABLOSUNUN YENİLENMESİ İŞİ
190. G.Ü.EĞİTİM FAK.UYG.ANAOKULU KAZAN DAİRESİ YAPILMASI İŞİ
191. G.Ü.GÜZEL SANATLAR FAK.TUNUS CAD.EK BİNA ÇATI ONARIMI İŞİ
192. G.Ü.TIP FAK.HASTANESİ TIBBİ ATIK DEPOSU TADİLAT İŞİ
193. İİBF.ASANSÖR MONTAJI VE YENİLEME İŞİ
194. G.Ü.HASTANESİ BİNA LED AYDINLATMASI YAPIM, GÖLBAŞI TRAFO KABLOLARI YENİLEME VE GÖLBAŞI ÇUBUK JENARATÖRLERİ BAKIM İŞİ
195. G.Ü.TEKNOLOJİ FAK.ISI SANTRALİ TEKNİSYEN ODASI TADİLAT İŞİ
196. G.Ü.SANAT TASRAIM FAK.,GÖLBAŞI YERLEŞKESİ ÇEVRE AYDINLATMA VE ATÖLYELER ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
197. G.Ü.MEDİKO PERSONEL YEMEKHANESİ VE DEPOLARI BOYA-GEF.K BLOK BODRUM KAT ODA TAD.-REK.BİNASI ODA BOYA-POLATLI FEN FAK.ODA TAD.
198. BESYO 2.KAT ODA YAPIMI, TEKNOLOJİ FAK. A BLOK ÇATI OLUKLARININ YENİLENMESİ, KAMPÜS HİZMET BİNASI ÇATI YAĞMUR OLUĞU YAPIMI, REK.BİNASI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON ROGARLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ

199. G.Ü.REKTÖRLÜK KAPALI OTOPIRK MALZEME DEPOSU VE ÇELİK RAF YAPILMASI İŞİ
200. G.Ü.SANAT TASARIM FAK.BEŞEVLER KAMPÜSÜ KANALİZASYON HATTI YENİLEME, TEMİZLİĞİ İLE ROĞAR YAPILMASI
201. G.Ü.ÇUBUK MYO.MERKEZ KAMPÜS; TEF, MEDİKO BİNASI, İÇ DENETİM OFİSİ ELEKTRİK TADİLAT İŞİ
202. G.Ü.GAZİ HASTAHNESİ BAŞHEKİMLİK GİRİŞİ VE HASTANE KORİDORU TADİLATI VE ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ
203. G.Ü.GEF RESİM İŞ BÖLÜMÜ ÇATI ONARIM İŞİ
204. G.Ü.UZAKTAN EĞİTİM Y.O., BİLİŞİM ENS.ÇATI ONARIMI VE İÇ MAHAL BOYA VE İLETİŞİM FAK.BOYA AHŞAP İMALAT VE KANALİZASYON İŞLERİ
205. G.Ü.HASTANESİ ÇÖP DEPOSU YANI TRAFOLARI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ BAKIM İŞİ

2.3.Sosyal DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

DKH- Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerimizin program ödeneği 12.000.000,00 TL olup, bu ödeneğin 5.500.000,00 TL'si öz gelirlerden (döner sermayeden aktarılan) ve 6.500.000,00 TL'si hazineden karşılanmak üzere verilmiştir. Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince bu sektördeki bütün ödenekler özel hesaba aktararak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

2.3.1. İmmunobioteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

2012 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırmalar sektöründe yer alan 2009K120670 numaralı İmmunobioteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi için 2.000.000 TL ödeneğin tamamı hazineden karşılanmak üzere öngörülmüş ve yıl içinde bu ödeneğin tamamı Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba devredilerek harcanmıştır.

2009 yılı yatırım programında etüd proje olarak ilk kez yer alan proje 2010-2011-2012 yılı yatırım programlarında da yer almıştır. Ancak proje tamamlanmadan 2013 yılı yatırım programından çıkartılmıştır.

- İlk kez 2009 yılı yatırım programında 500.000,00 TL ödenekle etüd proje olarak yer almıştır.
- 2010 yılı yatırım programında 10.000,00 TL ödenekle yer almıştır.
- 2011 yılı yatırım programında 5.000.000,00 TL ödenekle yer almıştır.
- 2012 yılı yatırım programında 2.000.000,00 TL ödenekle yer almıştır.

Bu projeden 6.558,49 TL'si 2012 yılında olmak üzere toplam 692.996,47 TL harcama yapılmıştır.

2.3.2. Plazma Teknolojileri İleri Araştırma Merkezi

2012 Yılı Yatırım Programında Sosyal (DKH) Teknolojik Araştırmalar Sektörü 2012K121110 numaralı Plazma Teknolojileri İleri Araştırma Merkezi projesi için 500.000,00 TL ödeneğin tamamı hazineden karşılanmak üzere öngörülmüş ve yıl içinde bu ödeneğin tamamı Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba devredilerek harcanmıştır.

2009 yılı yatırım programında etüd proje olarak ilk kez yer alan proje 2010-2011-2012 yılı yatırım programlarında da yer almıştır. Ancak proje tamamlanmadan 2013 yılı yatırım programından çıkartılmıştır.

- İlk kez 2011 yılı yatırım programında 100.000.-TL ödenekle etüd proje olarak yer almıştır.
- 2012 yılı yatırım programında 50.000.-TL ödenekle yine etüd proje olarak yer almıştır.

Bu projeden 46.841,64.-TL'si 2012 yılında olmak üzere toplam 98.556,40.-TL harcama yapılmıştır.

2.3.3. Fotonik Araştırma Merkezi

2012 Yılı Yatırım Programında Sosyal (DKH) Teknolojik Araştırmalar Sektörü 2011K120290 numaralı Fotonik Araştırma Merkezi projesi için 4.450.000 TL ödeneğin tamamı hazineden karşılanmak üzere öngörülmüş ve yıl içinde bu ödeneğin tamamı Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba devredilerek harcanmıştır.

2011K120290 numaralı bu proje, “fotonik aygıtların geliştirilmesi için araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu aygıtların üretim teknolojilerinin kazanılması amacıyla Gazi Üniversitesi bünyesinde bir “Fotonik Araştırma Merkezi” kurmaya yönelik bir altyapı projesidir. Daha önce Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2001K120590 numaralı proje ile kurulan Yarıiletken Teknolojileri İleri Araştırma Laboratuvarı altyapısı ile birleştirilerek Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gazi Fotonik), yönetmeliği 10 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuş; 25 Ocak 2012 tarihinde Yönetim Kurulu teşkil edilerek faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu merkezde fotonik aygıtlar için III-V grubu yarıiletken çoklu yapıli kristallerin üretim ve geliştirilmesi ar-ge çalışmalarını yapmak; bu malzemelerden KÖ dedektörler, sensörler, lazerler geliştirmek ve ilgili teknolojide yetkinliğe ulaşmak, geliştirilen lazer ve detektör prototiplerini ilgili sanayiye aktararak milli foton detektörlerinin ve yarıiletken lazerlerin üretilmesine katkı sağlamak; hacimli kristal büyütme ar-ge faaliyetleri yürütmek ve ilgili teknolojide kazanımlar elde etmek hedeflenmiştir.”

Kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde proje metninde ve Yönetmeliğinde yer alan faaliyetler gerçekleştirmeye başlanmıştır. Merkezin önemli faaliyetleri, 211K120290 numaralı proje kapsamında teknolojik altyapısının tamamlanması ve fotonik teknolojiye dayalı üstlendiği projelerin yürütülmesi ve proje iş paketlerinin gerçekleştirilmesidir.

Merkezimizin altyapı kurulumu bir taraftan proje takvimine göre devam ederken, mevcut potansiyel kullanılarak diğer mevcut projelerimiz yürütülmektedir. Ayrıca üretim sektörü destekli yeni projeler oluşturulmakta ve üretime katkı sağlayan ar-ge faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Fotonik Araştırma Merkezi altyapısının kurulumu yeni aygıt alımları ve diğer faaliyetlerle devam ettirilmiştir.

1) İş paketlerinde yer alan GaAs ve InGaAs fotodedektör/fotokatot yapıları başarı ile büyütülmüş ve karakterize edilmiştir. InGaAs fotodedektör yapılarının atmosferik şeffaf bölgede çalışabilecek kalitede olduğu belirlenmiştir. Epitaksiyel kristal büyütme sistemimizin (MBE) eksiklikleri tamamlanmış, yüksek kalitede kristal büyütebilecek şekilde bakımı gerçekleştirilmiştir. Sistemin bu iyileştirilmesi sayesinde, Ülkemizde sektör (Solentek A.Ş.-Bursa ve CW Enerji A.Ş.-Antalya) tarafından yerel uygulamalar için üretim hattı kurulması planlanan ve Milli Savunma Bakanlığı-Ulaştırma Bakanlığı tarafından uzay uygulamaları için üretimi hedeflenen çok eklemlili güneş hücrelerinin iyi verimlilikte büyütülmesi sağlanabilecektir. Bu hücre türleri ile ilgili geliştirme ve üretim teknolojisi, bu faaliyet dönemi içerisinde devam etmiş başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ülkemizde ilk olarak konsantre güneş hücresi paneli için 500 güneş kapasiteli 16 aynadan oluşan prototip yoğunlaştırıcı sistem geliştirilmiştir ve üretilmiştir.

2) Proje ile sağlanan destek kullanılarak, Merkezimiz bünyesinde kolesterol ve glikoz moleküllerine duyarlı biyo-sensor geliştirilmiştir. Bir öğrencimizin Doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen bu aygıt, üretim tekniği ve sonuçları itibarı ile özgün ürün niteliğindedir; geliştirilerek patentli ürün haline dönüştürülecektir.

3) Merkezimiz altyapı desteği ile LED aygıtlarının geliştirilmesi çalışmaları dönem içerisinde devam etmiş; iki farklı dalga boyunda ışınım yapabilen (iki renkli) özgün LED yapısı geliştirilmiş ve aygıt fabrikasyonu gerçekleştirilmiştir.

4) Üniversitelerimizde mevcut bulunan altyapıların paylaşımlı kullanımı prensibine dayalı olarak projemiz kapsamında tarif edilen kızılötesi foton detektörlerinin geliştirilmesi çalışmaları Bilkent Üniversitesi ile iş-birliği halinde yürütülmesine devam edilmiştir. Bu

kapsamda, merkezimizdeki kristal büyütme sistemi ile büyüttüğümüz kristallerden, proje iş-paketlerinde tanımlı olan 64 X 64 ve 128 X 128 dizinli InGaAs foton detektörlerinin üretimi Bilkent Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ürettiğimiz kristallerin aygıt kalifiye durumu belirlenmiş ve foton detektörlerin üretim teknolojisinde birikim ve yetkinlik kazanılmıştır. Bu işbirliği ile yürütülen çalışmalarla nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlaması ve bilginin sürekliliği-gelişiminin temini için, foton detektörü ar-ge çalışmaları bir doktora öğrencimize tez konusu olarak verilmiştir.

5) Merkez altyapısı proje metninde tarif edilen hedeflere yönelik olarak, üretim sektörünün ihtiyaçları, bizzat sektörle yapılan değerlendirmeler sonucunda önceliklendirilmiş ve ürüne dönüşebilir ar-ge faaliyetlerine yönlendirilmiştir. Yürütülen projelerle elde edilen altyapı ve ulaşılan deneyim sonucunda, üretim sektörü ile işbirliği geliştirmek amacıyla çok sayıda firma ile irtibata geçilmiştir. Bu firmalar elektro-optik, Güneş enerjisi, aydınlatma ve Savunma Sanayisi alanlarında faaliyetler yürüten firmalardan oluşmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi ile devam eden işbirliğini genişletmek amacıyla “Sensör ve Elektronik Sistemler Teknoloji Panellerine” katılım gerçekleştirilmiş, özellikle kızılötesi teknolojiye dayalı malzeme ve aygıt geliştirilmesi ihtiyaçlarına yönelik proje hazırlamamız talep edilmiştir. Kızılötesi görüntüleme, optik pencere, lazerle yer tespiti-takip sistemleri, zorlu tabiat şartlarına dayanıklı optik pencere, güdümlü füze başlığı gibi pek çok uygulama alanlarında kullanılacak olan Safir, Nd:YAG ve Germanyum hacimli mono kristallerinin üretim teknolojilerinin Türkiye’ye kazanımı talebine yönelik, ASELSAN müşteriliğinde hazırladığımız ve 14 Aralık 2012 tarihindeki toplantıda sunduğumuz proje uygun bulunmuş ve Kuvvet Komutanlıklarının uygun görüşünü almak üzere sevk edilmiştir. Planlamaya göre bu proje 2013 yılı içerisinde yürürlüğe girebilecektir. Bu sayede tedariki ve teknolojisi üretilen ülkelerin iznine ve sınırlamasına bağlı, kritik malzeme sınıfındaki kristaller Merkezimiz bünyesinde geliştirilecektir.

MSB ar-ge birimi ve Aselsan A.Ş ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fotonik Araştırma Merkezi projemiz kapsamında kurulan Czochralski hacimli kristal büyütme sistemi ile kızılötesi görüntüleme sistemleri (termal kamera) için optik mercek malzemesi olan ve yurt dışından ithal edilen Germanyum kristallerinin geliştirilmesine-üretilmesine öncelik verilmiştir. Bu amaca yönelik ASELSAN A.Ş ile “Kızılötesi Optik Elemanlar İçin

Germanyum Tek Kristali Geliştirme Çalışmaları” isimli proje geliştirilmiş; ar-ge çalışmaları Aselsan öz kaynaklarından desteklenecek formatta sözleşmesi imzalanarak Haziran 2012 itibarı ile proje başlatılmıştır. Bu proje ile ülkemizde ilk olarak hacimli tek-kristal Germanyum büyütülmesi ar-ge çalışmaları Merkezimizde başlatılmış; iyi kalitede mono kristaller üretilmesi başarılmıştır ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sayede kritik malzemeler arasında yer alan kızılötesi optik merceklerin üretim teknolojisinde yetkinlik ve ithal edilen bir ürünün yerlileştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, hacimli kristal büyütme teknolojisinde yetişmiş insan gücünü artırmaya yönelik olarak bu çalışmalara üç lisansüstü düzeyde öğrenci adapte edilmiştir. Bu sayının on kişiye çıkarılması planlanmıştır; böylece bu alanda çekirdek ekibin oluşması sağlanacaktır.

ASELSAN tarafından duyulan ihtiyaca göre öncelik verilerek başlattığımız Germanyum kristali ar-ge çalışmalarını, katıhal lazer kristallerinin (Nd:YAG) Türkiye’de geliştirilmesine genişletmek ve bu amaçla bir kristal büyütme sistemi daha kurarak Merkezimiz, ülkemizin hacimli kristal büyütme ar-ge çalışmalarında öncü hale gelecektir. Nd:YAG kristalinin büyütülmesi, MSB ihtiyaçlarına yönelik ASELSAN işbirliği ile önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç odaklı olarak projelendirilerek gerçekleştirilecektir. Böylece Fotonik Araştırma Projesi kapsamında kurulan Merkezimiz, 2001K120590 nolu proje ile sağlanan imkanlarla hem nano-boyutlu epitaksiyel kristal büyütme hem de bu proje ile sağlanan imkanlarla hacimli kristal büyütmede sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir mükemmeliyet merkezi hüviyetine kavuşmaktadır.

6) Fotonik Araştırma Merkezi Projesi ile altyapısı güçlenen Merkezimizde fotovoltaiik (PV) hücre araştırma-geliştirme faaliyetleri hız kazanmıştır. III-V grubu çok eklemlili ve kuantum kuyulu PV hücreler ve c-Si tabanlı PV hücreleri alanında hem malzeme geliştirme hem de hücre verimini olumlu etkileyen çalışmalar gerçekleştirilmektedir. San-tez projesi kapsamında birlikte çalıştığımız Solentek A.Ş (Bursa) dışında, ulaştığımız ar-ge sonuçları diğer üretim sektörüyle paylaşılmış; Clean Word Enerji (Antalya) ve Halk Enerji (Ankara) firmalarına panel üretimi alanında bilgiler aktarılmış; çalışmalarına katkı sağlanmaya devam edilmektedir.

7) Fotonik aygıtlar içerisinde yer alan LED aydınlatma teknolojileri alanında Merkezimizde oluşan bilgi birikimi ile aydınlatma ürünü geliştiren sektöre, ar-ge niteliği olan

ürüne ulaşmada destek verilmektedir. LED aydınlatma ürünlerinde standartların belirlenmesi ve ülkemizde sokak aydınlatmalarında LED armatürlerin kullanımının kontrollü olarak yaygınlaştırılması amacıyla Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen toplantılara katılım sağlanmış ve bu alanda çalışmalarımız devam etmektedir. LED aydınlatma ürünlerinin ölçüm-analiz ve standardizasyonuna ar-ge bazlı destek sağlayabilmek ve yürüttüğümüz LED geliştirme çalışmalarında kullanmak amacıyla Merkezimize bir aydınlatma karakterizasyon sistemi kazandırılmıştır. Aydınlatma sektörünün teknolojik problemlerini belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek hedefiyle, her yıl İstanbul'da düzenlenen LED&Lighting Fuar ve Konferansının bilim kurulunda yer alınmıştır. Bu faaliyetler sonucunda, yerli LED aydınlatma ürünlerinin uluslar arası standartlara uygun üretimlerinin gelişmesi için bazı firmalara tasarım-analiz bazında destek verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, İskenderun Cezaevi'nde mahkumların meslek edinmesi amacıyla yürütülen LED aydınlatma ürünlerinin üretim faaliyetleri için bilimsel eğitim ve ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu birimde, güneş panellerinin üretilmesi alanında meslek edinilmesi de proje kapsamında değerlendirilmektedir.

8) Merkez bünyesinde bulunan altyapı ve oluşan bilgi birikiminden yararlanarak çok sayıda Lisansüstü tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Merkezimizin faaliyet alanları ve altyapı imkanları diğer araştırma kurumlarına duyurulmuş; bu sayede üniversitemiz dışındaki diğer üniversitelerden lisansüstü tez öğrencileri deneysel araştırmalarını Merkezimizde gerçekleştirmektedir. Diğer araştırma kurumlarındaki araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin mevcut altyapı ve oluşan bilgi birikiminden daha fazla yararlanabilmesi için tanıtım ve çağrılar yapmaya devam etmekteyiz. Amacımız kamu desteğiyle kurulan araştırma merkezimizin tüm araştırmacılara hizmet verecek şekilde hizmet ve faaliyet alanını genişletmektir. Araştırma yapan araştırmacı ve öğrencilere, Merkez altyapısına kazandırılan ekipmanların kullanıcı eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu dönem içerisinde Merkezimizde 1 adedi uluslar arası, 2 adedi sektör destekli olmak üzere toplam 8 adet proje yürütülmektedir. Fotonik Araştırma Merkezi Projesi dışında, yürütülen projelerin toplam bütçesi 1.243.000,00 TL'dir. Ayrıca merkezimizde kurulan altyapı sayesinde sektör ve diğer araştırma kurumlarına, Merkezin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, döner sermaye üzerinden, test ve analizler gerçekleştirilmektedir.

2012 yılı içerisinde altyapı kurulumu ve yürütülen ar-ge çalışmalarını yürütmek hedefiyle gerekli olan makine-teçhizat, sarf, bakım-onarım ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Sarf faslından ar-ge faaliyetleri için gerekli malzemeler temin edilmiş; bakım-onarım faslından, Merkezimizin faaliyette bulunduğu binada Kristal büyütme sistemimiz için laboratuvar inşa işleri ve bazı cihazlarımızın bakımları gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı faslından, projede tarif edilen detektörlerin fabrikasyonu ve cihazlarımızın arızalarının giderilmesi ihtiyaçları için harcamalar gerçekleştirilmiştir. Makine-teçhizat faslından; Czochralski hacimli kristal büyütme sistemi, İkincil İyon Kütle Spektrometresi, Atomik Kuvvet Mikroskobu, X-Işını Kırınımı Cihazı, Difüzyon Fırınları, LED karakterizasyon sistemi, kristal kesme cihazı, kesintisiz güç kaynağı sistemleri alınarak Merkezimize kurulumları gerçekleştirilmiş ve işletilmeye başlanmıştır. Projemiz kapsamında en az lisans mezunu derecesine sahip dört adet proje destek uzmanı statüsünde personel çalıştırılmıştır. Bu dönem içerisinde söz konusu harcama kalemlerinden toplam 5.608.195,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Fotonik Araştırma Merkezi Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz, ürüne dönüşebilir somut çıktıları olan ar-ge faaliyetleri ve altyapı kurulumuna yapılan harcamalar dikkate alındığında 2012 yılı sonu itibarıyla projemiz %70 dolayında nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmıştır.

2.3.4. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2012 Yılı Yatırım Programı Eğitim (DKH) Teknolojik Araştırmalar Sektörü 2012K120650 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 5.500.000 TL ödeneğin tamamı öz gelirlerden miktardan karşılanmak üzere öngörülmüştür.. Maliye Bakanlığınca belirlenen “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince bu sektördeki bütün ödenekler özel hesaba aktarılarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Özel ödenek gelirlerinden 2012 yılında kaydedilen ödeneklerden, BAP tarafından desteklenen projelerin ihtiyaçları doğrultusunda 2012 yılı içerisinde harcama yapılmıştır. Bir yıllık proje olduğundan dolayı bu proje için yapılacak işler tamamlanmıştır.

Özel ödenek gelirlerinden 2012 yılında kaydedilen ve 2011 yılında devredilen ödeneklerden, BAP tarafından desteklenen projelerin ihtiyaçları doğrultusunda 2012 yılı içerisinde 4.064.400 TL harcama yapılmıştır. (2012 yılında ayrıca 7.955.693,04 TL tutarında akreditif kredisi açılmıştır).

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen (Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Altyapı ve Disiplinlerarası) projelerin, yatırım karakterli alımları, 2012K120650 kodlu bu proje ile ilişkilendirilmiş, doğrudan temin ve ihale yolu ile bu projeden harcamaları yapılmıştır. Ödeneğimizin yeterli olması nedeniyle herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Gazi Üniversitesi 1982 yılında kurulmuş olup Milli Eğitim Bakanlıđından devralınan eski binalarda, Ankara ili içerisinde şehrin dokuz ayrı bölgesinde yaklaşık 116 adet binayla eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. Eski binaların kullanımına devam edilmesi zorunlu olduğundan sürekli bakım ve onarım ihtiyacı doğmaktadır. Yine binaların eski olmasından ve ısı yalıtımlarının da bulunmamasından dolayı büyük enerji kayıpları ile birlikte elektrik, su, doğalgaz sarfiyatı çok fazla olmaktadır. Dağıntık kampus yapısı nedeniyle tek elden yürütülmesi gereken temizlik, güvenlik, taşıma ve yemek hizmetlerinin parçalanması nedeniyle bütçe harcamalarında sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca;

- Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda ödenek tahsis edilmemesi,
- Yatırım ödeneklerinde, öz gelirlerden öngörülen miktarda yatırım için ödenek ayrılamaması,
- Her yıl öğrenci sayısının artması,

- Yeni yatırımlar için proje ve ödenek tahsis edilmemesi,
- İhale mevzuatında sık sık değişikliklerin olması, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen sürelerin ihale sürecini uzatması ve çeşitli nedenlerle ihalelerin iptal edilmesi,
- Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programına göre üçer aylık dönemler itibariyle kullandırılması nedeniyle ödemelerde sıkıntı yaşanması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Öz gelirlerimiz bütçede öngörülen miktarlarda gerçekleşmediğinden ödeneklerimiz yetersiz kalmakta ve aradaki fark likitten ekleme yapmak suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır.

Üniversitemizde eğitim, sosyal ve spor alanlarının kalitesi artırılarak daha çağdaş bir eğitim-öğretim sunulması hedeflenmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programı'nda öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 4 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamaktadır. Ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda kütüphaneci, teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

EK-1 2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : **GAZİ ÜNİVERSİTESİ**

2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM=4

Sektör Adı : **Eğitim (Yüksek Öğretim)**

2012 Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
43244	438,	2008H032320	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Ankara	0,	47.000,	12.192,			10.000,	-	500			9.289,
42430	438,	2011H032280	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0,	30.000,	17.052,			9.750,	(+)	9.200			15.334,
42431	438,		Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2013	Ankara	0,	0,	0,			3.000,					1.824,
42424	438,	2012H030870	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0,	250,	0,			250,					260,
44040	438,	1999H050070	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara,Gölbaşı,Çubuk	0,	49.140,	44.140,			2.500,	-	2.500			0,
TOPLAM							0,	126.390,	73.384,	0,	0,	22.500,	0,	12.200,	0,	0,	26.707,

Sektör Adı : **Sağlık**

2012 Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
40443	438,	1998I001310	Çocuk Hastanesi (350 Yt, 65000 m2)	DÖNER SERMAYE	2013	Ankara	0,	49.654,	17.153,	0,	0,	1,					0
43884	438,	2010I000350	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2013	Ankara	0,	0,	0,	0,	0,	4.999,					5.973
40829	438,		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0,	25.000,	0,	0,	0,	5.000,	+	2.000			6.990
TOPLAM							0,	74.654,	17.153,	0,	0,	10.000,	0,	2.000,	0,	0,	12.963,

Sektör Adı : **DKH (Sosyal-Teknolojik Araştırma)**

2012 Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
41268	438,	2009K120670	İmmunobiyoteknoloji Araş. ve Uyg. Mrk.	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0,	8.000,	5.933,	0,	0,	2.000,					2.000,
43160	438,	2011K120290	Fotanınik Araştırma Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Ankara	0,	12.198,	3.210,	0,	0,	4.450,					4.450,
43154	438,	2012K120650	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0,	5.500,	0,	0,	0,	5.500,					5.500,
43155	438,		Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL GELİR	2012	Ankara	0,	0,	0,	0,	0,	5.500,					5.500,
43142	438,	2012K121110	Plazma Teknolojileri İleri Araştırma Mrk.	ÖZEL BÜTÇE	2012	Ankara	0,	50,	0,	0,	0,	50,					50,
TOPLAM							0,	5.500,	0,	0,	0,	12.000,	0,	0,	0,	0,	12.000,

EK-2 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU**2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU****Kurum Adı :** GAZİ ÜNİVERSİTESİ**Bütçe Türü:** ÖZEL BÜTÇE

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL ARALIK SONU

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özk.		Kredi	Özk.		Kredi	Özk.		Kredi	Özk.	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		126.390			73.384			22.500			28.700			26.707
Sağlık	2		25.000						5.000			7.000			6.990
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	4		25.748			9.143			12.000			12.000			12.000
TOPLAM	10		177.138			82.527			39.500			47.700			45.697

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL ARALIK SONU

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özk.		Kredi	Özk.		Kredi	Özk.		Kredi	Özk.	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	2		74.654			17.153			5.000			5.000			5.973
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	2		74.654			17.153			5.000			5.000			5.973

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
